笠岡市
橋梁・道路附属物等　長寿命化修繕計画

令和７年４月

笠岡市　建設部建設事業課

目次

- **１.はじめに** ・・・・・・・・・ **1**
- **２.計画の目的** ・・・・・・・・・ **3**
- **３.対象施設** ・・・・・・・・・ **5**
- **４.計画期間** ・・・・・・・・・ **5**
- **５.長寿命化修繕計画の基本方針** ・・・・・・・・・ **5**
  - 基本方針1　定期点検の実施 ・・・・・・・・・ **6**
  - 基本方針2　管理区分の設定 ・・・・・・・・・ **7**
  - 基本方針3　長寿命化及び補修・更新に関する方針 ・・・・・・・・・ **8**
  - 基本方針4　日常的な維持管理及び異常時の対応 ・・・・・・・・・ **9**
  - 基本方針5　人材育成等 ・・・・・・・・・ **9**
- **６.新技術等の活用方針** ・・・・・・・・・ **10**
- **７.維持管理費用の縮減に関する方針** ・・・・・・・・・ **10**
- **８.定期点検の結果** ・・・・・・・・・ **11**
- **９.対策実施状況** ・・・・・・・・・ **13**
- **１０.対策内容と実施時期** ・・・・・・・・・ **13**
- **１１.長寿命化修繕計画による効果と対策費用** ・・・・・・・・・ **14**
- **１2.橋梁　点検・修繕計画一覧表** ・・・・・・・・・ **15**
- **１3.大型カルバート　点検・修繕計画一覧表** ・・・・・・・・・ **23**

１．はじめに

▼　計画策定の背景

平成２５年１１月、国において「インフラ長寿命化基本計画」（以下「基本計画」という）が策定されました。

この基本計画は、国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るとともに、維持管理・更新に係る産業（メンテナンス産業）の競争力を確保するための方向性を示すものとして、国や地方公共団体、その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象に、国や地方公共団体が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進することとしています。

この基本計画に基づき、本市では平成２８年６月に「笠岡市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という）を策定し、長期的な視点をもって、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、財政負担の軽減・平準化、公共施設等の最適な配置の実現に取り組んでいます。

本計画は、総合管理計画に基づく、「橋梁」の戦略的な維持管理・更新等に係る取り組みを具体的に定めたものとなります。

▼　これまでの取り組み

▼　笠岡市が管理する橋梁の現状

笠岡市が管理する橋梁は、以下のとおりです。

道路橋梁

- 橋長15m以上の橋梁　52 橋
- 橋長15m未満の橋梁　705 橋

道路付属物等

- 大型カルバート　3 基

これらの多くは、高度経済成長期以降に集中的に整備され、今後３０年で建設後５０年を経過する割合が急速に増加し、老朽化による安全性の低下や補修・架替えなどの維持費が増大することが予測されています。

今後、限られた予算や人員の中、従来の「事後保全型維持管理（※）」を全ての橋梁に行った場合、適切な維持管理を続けることが困難になります。

年度別架設橋梁数

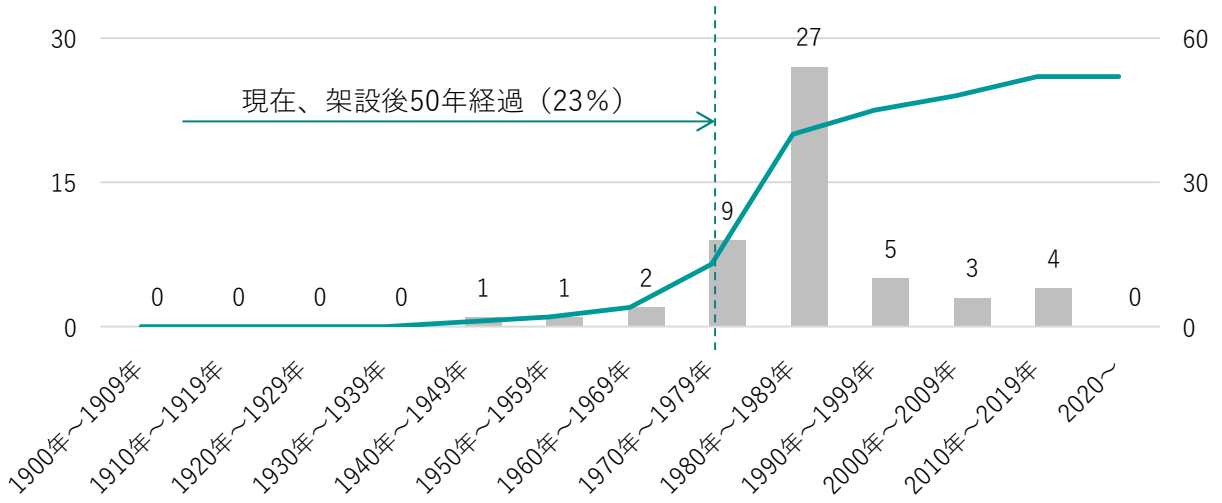

架設後50年経過橋梁数の推移

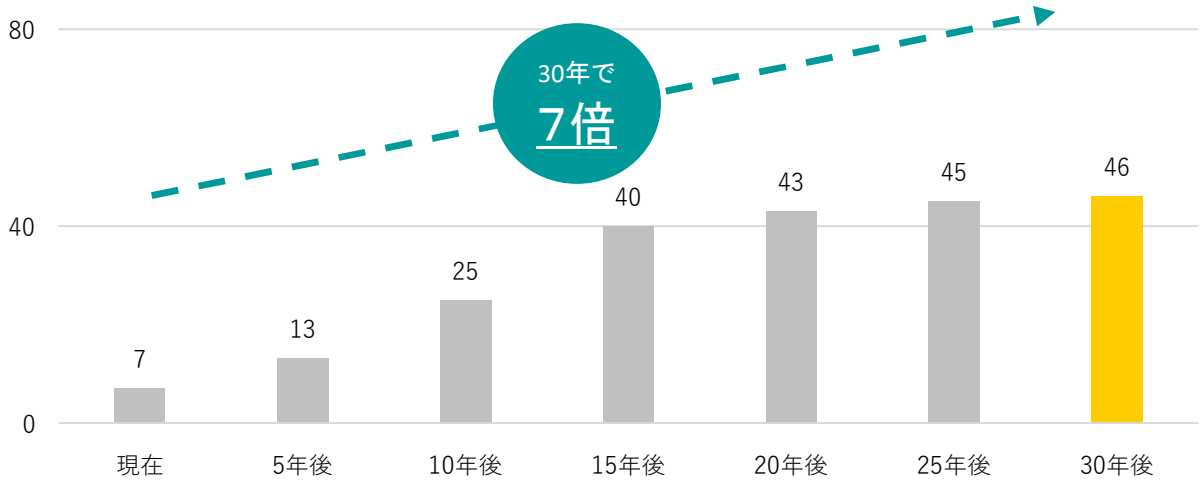

※上記の2つのグラフは、架設年次が判明している橋長15m以上の52橋で集計しています。

2. 計画の目的

今後予想される橋梁の老朽化及び維持管理費の増大に対応するため、従来の「事後保全型維持管理」から、損傷が軽微なうちに補修を行う「予防保全型維持管理」に転換し、点検・計画・修繕という橋梁アセットマネジメントの考え方を導入し、道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図るとともに維持管理及び更新費用の縮減と平準化を目的とします。

▼ 橋梁アセットマネジメント

• 橋梁アセットマネジメントとは

橋梁アセットマネジメントとは、橋梁を資産（アセット）としてとらえ、橋梁の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、予算的制約の中でどのような対策をいつどこに行うのが最適であるかを考慮して、計画的かつ効率的に管理（マネジメント）する手法です。

• マネジメントサイクルの構築

データベースを中心としたマネジメントサイクルを構築し、点検結果及び補修履歴をデータベースに登録・蓄積することで、点検・修繕計画に活用し、計画的な維持管理を行います。

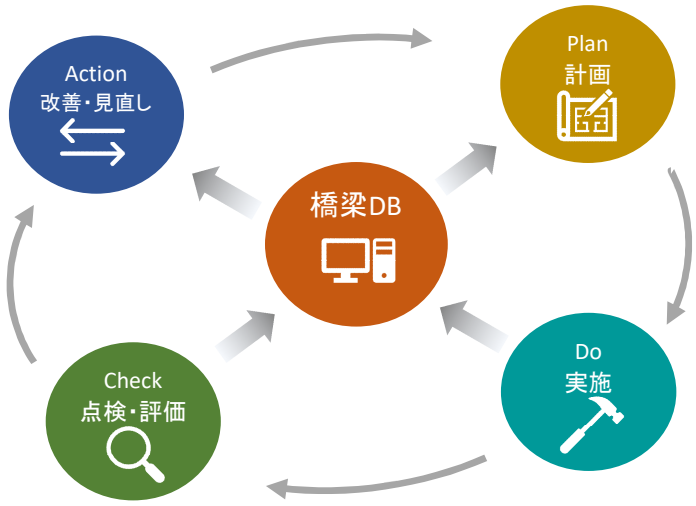

Plan（計画）
・橋梁長寿命化修繕計画の策定

Do（実施）
・対策の実施
・補修履歴等の整理

Check　点検・評価
・点検の実施
・橋梁の健全度評価

Action　改善・見直し
・劣化予測
・点検、補修計画の見直し
・効果の把握

橋梁DB
・橋梁データの蓄積、管理

▼　「事後保全型維持管理」から「予防保全維持管理」へ

ー事後保全型維持管理ー

事後保全型維持管理とは、
　損傷が進行した段階で対策を行う保全方法
例えると
「病気の自覚症状が生じてから治療する」

ー予防保全型維持管理ー

予防保全型維持管理とは、
　損傷が軽微な段階で対策を行う保全方法
例えると
「健康診断を定期的に受診して健康体を維持する」

・対策費用の低減

損傷が著しい段階で補修するため、大規模な補修が必要となり対策費用が高額になる。

損傷が軽微な段階で補修するため、簡易な補修となり対策費用を抑えることができる。

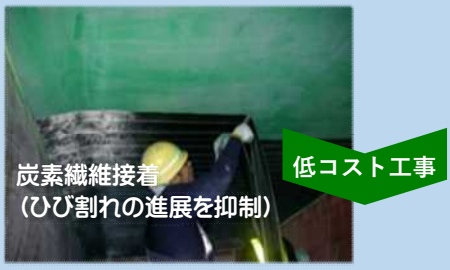

・対策費用の平準化

突発的に対策が必要となり、年度によって必要費用にバラつきが生じる。また、補修費用の予測がつきにくく、補修計画も立てにくい。

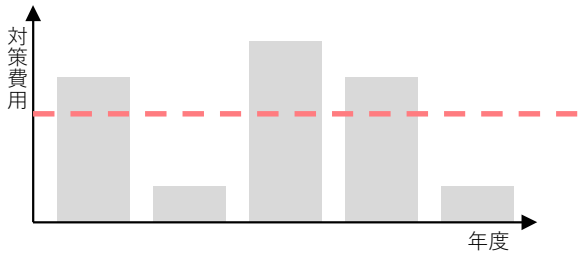

補修時期や補修費用をあらかじめ把握することで計画的な補修実施と予算確保が可能となり、年度の必要費用を平準化できる。

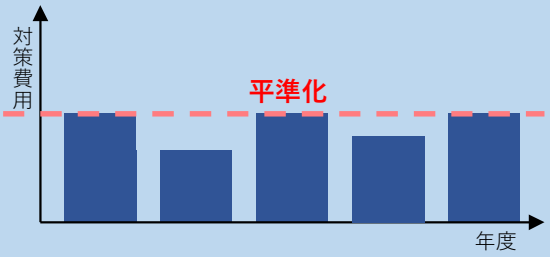

・長寿命化

著しい損傷が発覚するまで対策を行わないため、短命化の恐れがある。

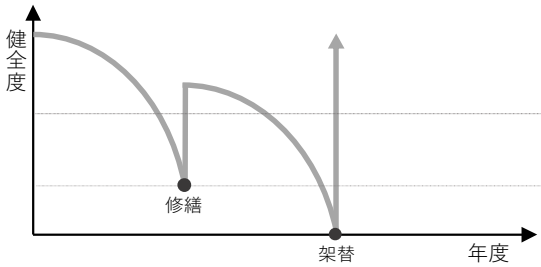

致命的な損傷に至る前に予防的に対策を行うことで長寿命化を図る事が可能となる。

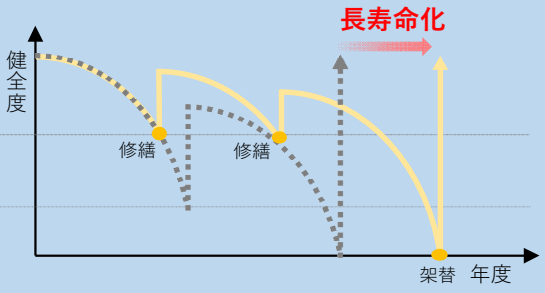

3. 対象施設

本計画の対象施設は、市が管理する橋長２ｍ以上の道路橋梁及び道路付属物等とします。

道路橋梁	757 橋
● コンクリート橋	633 橋
● 鋼橋	19 橋
● その他（石橋・木橋等）	105 橋

道路付属物等	
● 大型カルバート	3 基

4．計画期間

計画期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。
ただし、橋梁の状態は経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化するため、点検結果等を踏まえて、適宜計画を更新するものとします。

5．長寿命化修繕計画の基本方針

本計画の基本方針は、下記の５点とします。

基本方針 ①　定期点検の実施

対象施設の健全度を把握するため、定期点検を実施します。

基本方針 ②　管理区分の設定

効果的且つ持続可能な維持管理を行うため管理区分を設定します。

基本方針 ③　長寿命化及び補修・更新に関する方針

管理区分毎に管理水準を設定し、対策を図ります。

基本方針 ④　日常的な維持管理及び異常時の対応

道路パトロールの実施及び災害時等は異常時点検を実施します。

基本方針 ⑤　人材育成等

適切な維持管理を行うため、人材育成に努めます。

基本方針①

定期点検の実施

橋梁の健全度を把握するため、道路法施行規則第４条５の６に則り、定期点検を５年に１回の頻度で近接目視を基本に実施します。

道路法施行規則　第４条５の６

トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの（以下この条において「トンネル等」という。）の点検は、トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。

▼　健全度の評価方法

岡山県道路橋梁点検マニュアル（案）に基づき、橋梁を構成する部材の健全度を損傷の種類毎に評価し、部材の重要性や損傷の進行状況、環境状況など様々な要因を総合的に勘案し、「橋梁」の健全度を評価します。

損傷個所の評価

近接目視を基本とし、損傷個所を下記の損傷区分で評価する。

a:健全	b:ほぼ健全	c:損傷度小	d:損傷度中	e:損傷度大

◎橋脚1本のひび割れを評価

部材毎の評価

損傷箇所の評価をもとに部材を下記の対策区分で評価する。

A:補修不要	B:経過観察	C:予防的補修実施	E:早期補修実施

◎下部工を評価

橋梁全体の評価

部材の評価をもとに橋梁全体を下記の対策区分で評価する。

A:補修不要	B:経過観察	C:予防的補修実施	M:維持的補修実	E:早期補修実施

◎橋梁全体を評価

判定区分で評価

橋梁全体の対策区分から全国統一評価基準の判定区分で評価する。

Ⅰ:健全	Ⅱ:予防保全段階	Ⅲ:早期措置段階	Ⅳ:緊急処置段階
・道路橋の機能に支障が生じていない状態	・道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	・道路橋の機能に障害が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態	・道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

基本方針②　管理区分の設定

限られた予算・人員で最善の維持管理を行うため、対象施設を重要度に応じた管理区分に分け、管理すべき水準をそれぞれで定義することで、効果的かつ持続可能な維持管理を行います。

管理区分１　予防保全型維持管理を実施し、高い健全度の維持と長寿命化を図る。

対象：通行規制による社会的影響の大きい橋梁、施工規模が大きい橋梁
耐震性に劣る橋梁

通行規制による社会的影響の大きい橋

- 跨線・跨道橋　15 橋
- 大型カルバート　3 基

施工規模が大きい橋梁

- 橋長１５m以上の橋梁　42 橋

耐震性に劣る橋梁

- ２径間以上の橋梁　33 橋

管理区分２　事後保全型維持管理を実施し、社会的影響の無い範囲で健全度を維持する。

対象：比較的構造が単純な橋梁

比較的構造が単純な橋梁

- 橋長１５m未満かつ単径間の橋梁　667 橋

管理区分３　架替又は撤去を前提とし、対策時期まで最低限の維持管理を行う。

対象：架替えた方が経済的優位となる橋梁、集約化撤去を予定している橋梁

架替えた方が経済的優位となる橋梁

- 高齢の石橋・木橋　0 橋
- 被災した橋梁　0 橋

集約化撤去を予定している橋梁　2 橋

基本方針③　長寿命化及び補修・更新に関する方針

管理区分毎に管理水準を設定し、健全度の評価に基づき、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう対策を行います。

▼ 管理水準

管理区分１　予防保全型維持管理を実施し、高い健全度の維持と長寿命化を図る。

管理区分２　事後保全型維持管理を実施し、社会的影響の無い範囲で健全度を維持する。

管理区分３　架替又は撤去を前提とし、対策時期まで最低限の維持管理を行う。

▼ 管理水準の考え方

下の図は、対策区分Ｂ・Ｃ・Ｅで補修を実施した場合のイメージ図です。
対策区分Ｂで補修した場合、補修回数が多くなり、総補修費も高額になります。
対策区分Ｅで補修した場合、事後保全的な補修であり、1回当りの補修費が高く、総工事費も高額になります。
予算縮小の観点から対策区分Ｃでの補修が最適と考えられます。しかしながら、限られた予算及び人員の中では全ての橋梁を対策区分Ｃで補修することは現実的でありません。
管理区分１に分類する重要な橋梁または規模が大きく対策区分ＣとＥで補修した場合の補修費の差が大きい橋梁を優先的に対策区分Ｃで補修し、高い健全度の維持と長寿命化を図ります。
管理区分２の橋梁は、道路機能の維持を目的に対策を実施します。
管理区分３の橋梁は、架替又は撤去を予定しており、状態を回復させる修繕は基本的に行わず対策時期まで最低限の維持管理を行います。

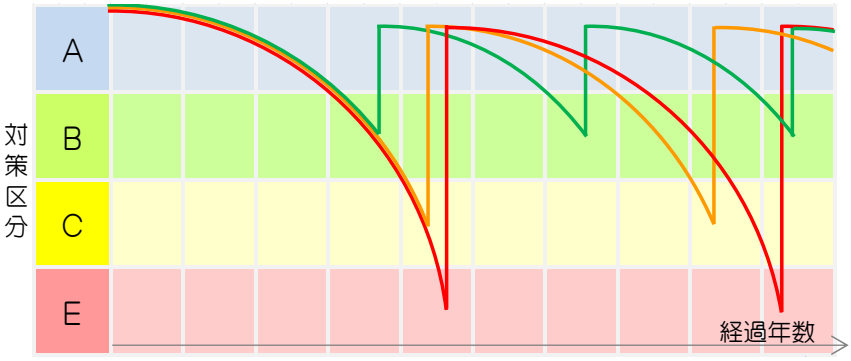

補修時期	補修費	補修回数	総補修費
対策区分Bで補修	10百万円	3回	30百万円
対策区分Cで補修	12百万円	2回	24百万円
対策区分Eで補修	20百万円	2回	40百万円

補修サイクルのイメージ

▼ 対策実施時期

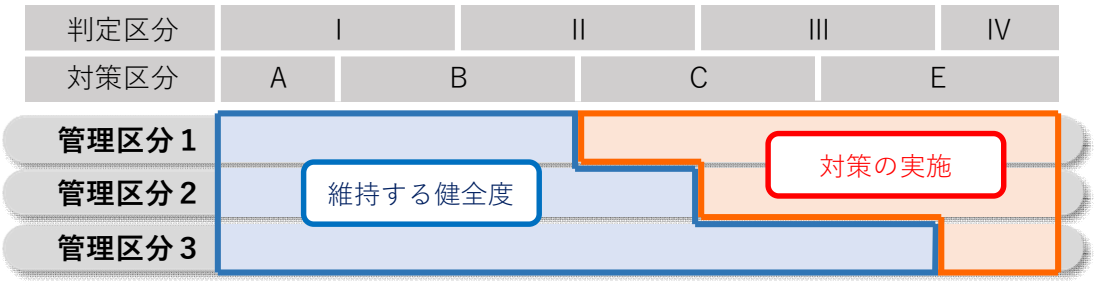

▼ 優先順位の考え方

橋梁の補修優先度は、損傷状況を優先的に考慮しますが、同程度の損傷状況の場合、橋梁の重要度、損傷要因、損傷部材の種類などを総合的に勘案し決定します。

優先度評価指標	評価内容
橋梁の重要度	● 跨線、跨道橋など第３者へ影響のある橋梁を優先 ● 緊急輸送道路上にある橋梁を優先 ● 橋長の長い橋梁を優先
損傷要因	● 交通量の多い橋梁を優先 ● 塩害地域にある橋梁を優先
損傷部材	● 主桁や床板等の主部材に損傷がある橋梁を優先

基本方針④　日常的な維持管理及び異常時の対応

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、日常点検（車上目視、遠方目視）などを行います。

また、地震等の災害時や橋梁部材に異常が発見された場合には、異常時点検を実施して橋梁の安全性を確認し適切に対応します。

基本方針⑤　人材育成等

適切な点検や補修を実施するために、橋梁に関する研修会等に参加し、職員の点検・補修能力の向上を図ります。

橋梁点検実習状況

6．新技術等の活用方針

▼　新技術等の活用方針

点検、補修設計、補修工事の全ての事業において、従来技術に比べ維持管理費用の縮減（定期点検の効率化、修繕等の措置の省力化等）が見込まれる場合は積極的に新技術等を活用します。

▼　新技術等の活用に関する目標

令和１０年度までに管理橋梁数の約２０橋で新技術等を活用することを目標とし、約１００万円の費用の縮減や事業の効率化を図ります。

7．維持管理費用の縮減に関する方針

▼　維持管理費用の縮減に関する方針

定期点検により損傷の早期把握及び計画的な補修を行うことで、大規模補修や更新を回避して費用の縮減を図ります。また、新技術の積極的な活用と社会経済情勢や、橋梁の利用状況及び地元住民の方々の意見等を踏まえ、迂回路が存在する橋梁については、集約化・撤去を検討し、維持管理費用の縮減を目指します。

▼　維持管理費用の縮減に関する目標

令和１０年度までに迂回路が存在する管理橋梁のうち、１橋の集約化・撤去を目標とし、約２００万円の維持管理費用の縮減を図ります。

8．定期点検の結果

2019年度から2023年度（2巡目）の点検結果は、以下のとおりでした。
判定区分Ⅲ・Ⅳは損傷有として損傷率を表示しています。

▼ 管理区分別

	Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		
管理区分	A	B		C(M)		E		損傷率	損傷率グラフ
管理区分1	39	7	18	12	16	0	1	31%	31.2%
管理区分2	394	87	90	47	45	1	1	7%	7.1%
管理区分3	0	0	0	0	2	0	0	0%	0.0%

0% 30% 60%

※管理区分1はC-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを損傷有としています。

※管理区分3はE-Ⅳを損傷有としています。

▼ 経過年数別

経過年数	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	損傷率	損傷率グラフ
● 橋長１５m以上						
0～9年	2	0	0	0	-	0.0%
10～19年	2	2	0	0	0%	0.0%
20～29年	1	2	0	0	0%	0.0%
30～39年	11	7	0	0	0%	0.0%
40～49年	6	6	6	0	33%	33.3%
50～59年	3	0	1	0	25%	25.0%
60～69年	0	2	0	0	0%	0.0%
70～79年	0	0	0	0	-	0.0%
80～89年	0	1	0	0	0%	0.0%
90～99年	0	0	0	0	-	0.0%
100年以上	0	0	0	0	-	0.0%
不明	0	0	0	0	-	0.0%
● 橋長１５m未満						
0～9年	3	1	0	0	0%	0.0%
10～19年	6	2	0	0	0%	0.0%
20～29年	12	3	0	0	0%	0.0%
30～39年	10	1	1	0	8%	8.3%
40～49年	1	4	0	0	0%	0.0%
50～59年	0	0	0	0	-	0.0%
60～69年	2	0	0	0	0%	0.0%
70～79年	1	0	0	0	0%	0.0%
80～89年	1	0	0	0	0%	0.0%
90～99年	0	0	1	0	100%	100.0%
100年以上	1	0	0	0	0%	0.0%
不明	465	136	55	2	9%	8.7%

0% 50% 100%

▼ 橋種別

橋種	I	II	III	IV	損傷率	損傷率グラフ
● 道路橋梁						
コンクリート橋	440	140	52	1	8%	8.4%
鋼橋	3	9	7	0	37%	36.8%
石橋・木橋等	84	15	5	1	6%	5.7%
● 道路付属物等						
大型カルバート	0	3	0	0	0%	0.0%

0% 50% 100%

▼ 部材別

部材	I	II	III	IV	損傷率	損傷率グラフ
主桁	295	58	14	1	4%	4.1%
横桁	37	8	1	0	2%	2.2%
床版	847	152	45	3	5%	4.6%
下部構造	638	96	24	1	3%	3.3%
支承部	627	18	2	0	0%	0.3%

0% 30%

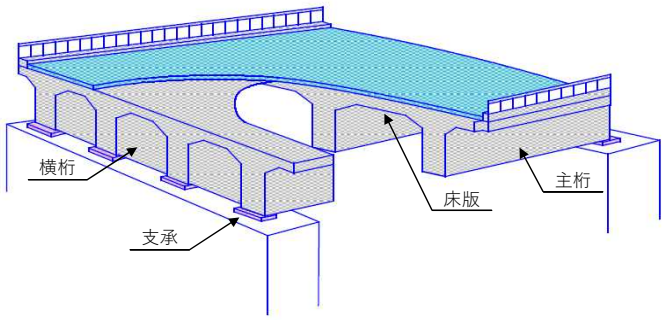

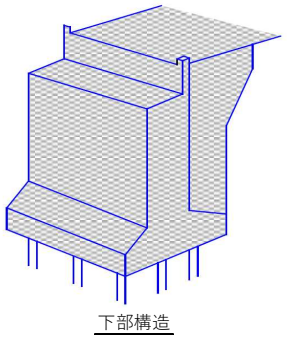

9．対策実施状況

長寿命化修繕計画を策定した2016年度から現在に至るまでの補修実績は、以下のとおりです。

年度	補修件数	主な補修実施橋梁
2016	8	作立橋、吉田川3号橋（相生橋）
2017	10	今立川3号橋、下田中橋
2018	15	新涯橋、浅香川2号橋
2019	3	美の浜3号橋、富岡15号橋
2020	9	干拓3号大橋、尾坂1号橋
2021	13	尾坂川13号橋(渡橋)、富岡9号橋
2022	15	笠岡2号橋、大野呂川8号橋
2023	4	吉田川13号橋（助実下橋）
合計	77	

点検結果

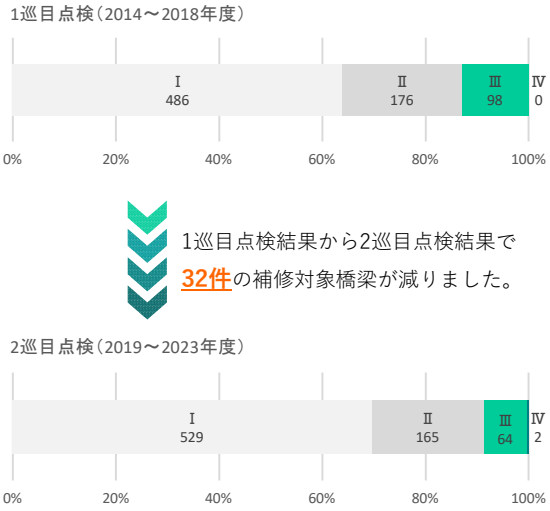

１０．対策内容と実施期間

次回の点検や対策内容、実施時期等については、「12．橋梁　点検・修繕計画一覧表」及び「13．大型カルバート点検・修繕計画一覧表」のとおりです。

１１．長寿命化計画による効果と対策費用

２巡目点検（2019～2023年度）の点検結果を基に,今後４０年間の対策費用をシミュレーションした結果、単年度平均で約８千万円の対策費用が必要となりますが、従来の事後保全型の維持管理と比較すると、約３９億円のコスト縮減が見込まれるとともに、一時的なコスト増も抑制され必要予算の平準化が可能となります。

事後保全型と予防保全型の将来事業費予測

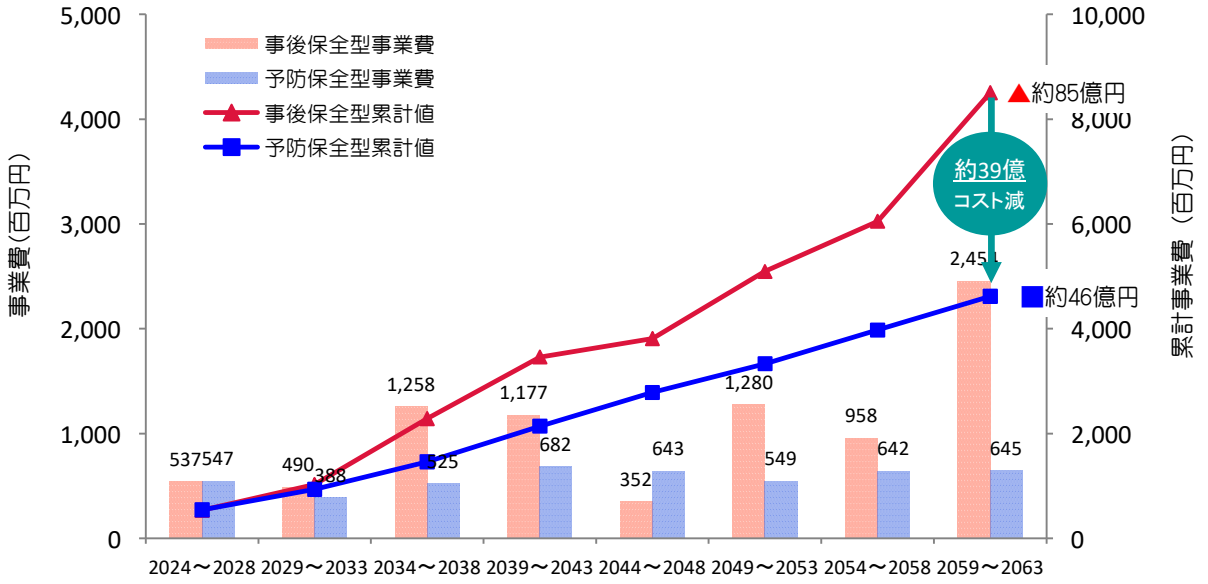

※　上記のグラフは、現時点での点検結果・標準的な工法・単価などに基づき試算したものです。そのため、今後の点検結果や補修状況等により変化するものであり、担保されたものではありません。

12. 橋梁　点検・修繕計画一覧表

○：点検計画
●：修繕計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2031)	(2032)	(2033)		
1	長迫川5号橋	山口井立線	笠岡市山口	1982	42	15.6	3.3	1	PC橋		2019	C	Ⅲ	○	●				○					断面修復	0.9
2	谷尻橋	山口井立線	笠岡市山口	1985	39	14.5	5	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
1	楠橋	歩坪楠線	笠岡市甲弩	1959	65	17	4.6	2	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
1	尾坂川15号橋(米田橋)	竹ノ内線	笠岡市山口	1975	49	18	4.1	3	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				補修済み(H28年度)	3
1	吉比須橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	1975	49	16.7	9.6	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
1	尾坂川2号橋(師補橋)	甲弩9号山手舟村線	笠岡市甲弩	1988	36	20.5	1.9	1	鋼橋		2019	C	Ⅱ	○					○						
1	尾坂川3号橋(山手橋)	甲弩79号北畑山手線	笠岡市甲弩	2019	5	31	4.7	1	PC橋		2023	A	Ⅰ					○					○	架替済み(R4年度)	132.5
1	寺道橋	甲弩130号山手線	笠岡市甲弩	1980	44	22	5.2	1	PC橋		2019	C	Ⅲ	○	●				○					ひび割れ注入、断面修復、橋面防水、伸縮装置取替工	4
1	尾坂川8号橋(岡田大橋)	甲弩16号岡田上作立線	笠岡市甲弩	1972	52	19	1.7	6	石橋		2022	A	Ⅰ				○					○		災害により落橋。架け替え工事実施済 補修(架け替え)済み(R1年度)	10
1	尾坂川10号橋(岡田上橋)	甲弩21号岡田中曽根線	笠岡市甲弩	1982	42	19.6	1.6	5	RC橋		2020	C	Ⅲ		○	●				○				一部補修済み(H28年度：1百万円) ひび割れ注入	1.4
1	作立橋	甲弩98号岡田下中曽根線	笠岡市甲弩	1940	84	19	3.7	2	PC橋		2021	B	Ⅱ			○					○			補修済み(H28年度)	1
1	吉田川3号橋(相生橋)	相生63号孫右エ門バナ宮ノ前第壱号線	笠岡市相生	1987	37	18.5	4.9	3	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み(H28年度)	13
1	吉田川1号橋(天神橋)	金浦34号町分新川平線	笠岡市金浦	1997	27	15.8	3.8	2	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
1	今立川2号橋	西大島新田22号川東中島線	笠岡市西大島新田	1983	41	26.5	6.2	2	PC橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
1	吉田川7号橋(鏡谷橋)	吉浜19号井出池尻壱号鏡壱号線	笠岡市吉浜	1987	37	17.9	3.1	1	PC橋		2021	B	Ⅱ			○					○			補修済み(H28年度)	6
1	今立川3号橋	富岡57号中六丁目拾丁目線	笠岡市富岡	1978	46	25	3.7	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み(H29年度)	1
1	新庄橋	絵師26号壱丁目線	笠岡市絵師	1998	26	21.7	10.3	1	PC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
1	新遅橋	白石島16号塚ノ平塚ノ前線	笠岡市白石島	1982	42	38	5	2	PC橋		2021	B	Ⅱ			○					○			補修済み(H30年度)	16
1	かえで橋(側道橋)	番町42号十一番町線	笠岡市八番町	1987	37	15.5	3.8	1	鋼橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
1	山手下橋	甲弩89号山手下原線	笠岡市甲弩	1983	41	21.5	5.1	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
1	岡田橋	甲弩10号千田楠線	笠岡市甲弩	1965	59	35.3	8.5	2	鋼橋		2019	A	Ⅰ	○					○					補修済み(H28年度)	24
1	尾坂川4号橋(山手上橋)	甲弩136号山手線	笠岡市甲弩	1961	63	21.3	1.5	5	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○				補修済み(H28年度)	1.4
1	尾坂川23号橋(向原橋)	新賀187号神子免向原線	笠岡市新賀	1984	40	15.2	5.62	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
1	新賀2号橋	新賀198号森ヶ市シホケガタワ線	笠岡市新賀	1970	54	17.8	2.3	1	PC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
1	下田中橋	大河111号鯰下田中線	笠岡市大河	1981	43	22	2.2	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				補修済み(H29年度)	2
1	棒木橋	大河115号堂之内池之内線	笠岡市大河	1979	45	24	4.8	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				補修済み(H29年度)	4
1	銀山橋	吉浜114号上ノ町壱号狐崎壱号線	笠岡市吉浜	1971	53	23	8.1	1	鋼橋		2019	C	Ⅲ	○		●				○				一部補修済み(H29年度：2百万円) 下部工ひび割れ補修	0.5
1	隅田川1号橋	笠岡159号西ノ浜新田西ノ浜線	笠岡市笠岡	2015	9	47.7	11.5	3	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
1	今立川1号橋	西大島新田26号三丁目山下線	笠岡市西大島新田	1982	42	27.9	6.2	2	PC橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
1	助実橋	東大戸116号助実大井南線	笠岡市東大戸	1987	37	57.5	5	3	PC橋	跨道	2021	A	Ⅰ			○					○				
1	裸橋	西大戸75号矢立鳴渕線	笠岡市西大戸	1987	37	40.5	5.3	3	PC橋	跨道	2021	A	Ⅰ			○					○				
1	浮田橋	小平井今立線	笠岡市小平井	1987	37	58.1	6.4	3	PC橋	跨道	2021	B	Ⅱ			○					○				
1	内山橋	篠坂118号佐山大戸原線	笠岡市篠坂	1987	37	52.1	5	3	PC橋	跨道	2020	A	Ⅰ		○					○					
1	仁池橋	入田98号平ヶ市迫辻線	笠岡市入田	1987	37	46.6	6.1	3	PC橋	跨道	2020	A	Ⅰ		○					○					
1	松葉佐橋	篠坂158号中尾十二ヶ谷線	笠岡市篠坂	1987	37	42	5	3	PC橋	跨道	2020	A	Ⅰ		○					○					
1	平倉西橋	入田111号平倉線	笠岡市入田	1987	37	46	4	3	PC橋	跨道	2020	A	Ⅰ		○					○					
1	平倉東橋	入田113号仁井屋平倉線	笠岡市入田	1987	37	44.4	4	3	PC橋	跨道	2020	C	Ⅱ		○					○					
1	開面橋	入田116号開面中山線	笠岡市入田	1987	37	43.7	4	3	PC橋	跨道	2021	A	Ⅰ			○					○				
1	金山橋	今立68号山王金山線	笠岡市今立	1987	37	39.8	4	3	PC橋	跨道	2021	A	Ⅰ			○					○				
1	金崎大橋	笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線	笠岡市笠岡	1978	46	150	10	4	PC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R3年度)	3.4
1	干拓1号大橋	笠岡湾干拓4号平成町拓海町線	笠岡市カブト東町	1980	44	75	8.2	3	鋼橋		2021	C	Ⅲ		●		●	○	●					ひび割れ注入、断面修復、支承取替工、伸縮装置取替工	11.5
1	干拓3号大橋	笠岡湾干拓6号平成町カブト西町線	笠岡市カブト西町	1981	43	75	8.2	3	鋼橋		2021	C	Ⅲ		●		●	○						一部補修済みR2年度：24.8百万円) 下部工補修	0.1
1	笠岡湾干拓1号橋	笠岡湾干拓6号平成町カブト南町線	笠岡市カブト南町	1990	34	17.2	8.2	1	PC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
1	笠岡湾干拓2号橋	笠岡湾干拓8号カブト南町線	笠岡市カブト南町	1980	44	17.2	8.2	1	PC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み(H28年度)	4
1	笠岡湾干拓3号橋	笠岡湾干拓19号カブト南町カブト西町線	笠岡市カブト南町	1978	46	17.2	7.2	1	PC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み(H28年度)	8
1	大河東橋	大井南1号線	笠岡市大河	1990	34	21.35	12.8	1	PC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
1	吉田川8号橋(河中橋)	吉浜14号井出池尻壱号鏡壱号線	笠岡市吉浜	1987	37	15.1	5	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
1	山口新橋	山口133号香田森ヶ市線	笠岡市山口	2002	22	15	6.2	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
1	尾坂川13号橋(渡橋)	甲弩24号橋線	笠岡市甲弩	不明		14.6	3.5	2	PC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R3年度)	1
1	入江橋	富岡西大島新田線	笠岡市西大島	1991	33	45.6	6.2	2	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
1	青木橋	絵師9号山底猪ノ谷線	笠岡市絵師	2007	17	16.1	5.2	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
1	絵師橋	絵師15号山底線	笠岡市絵師	2005	19	19.4	5.2	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	笠岡1号橋	金崎浜田線	笠岡市笠岡	不明		2.9	4.45	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	隅田川5号橋	金崎浜田線	笠岡市笠岡	不明		4.7	5	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	笠岡2号橋	笠岡駅今井線	笠岡市笠岡	不明		2.9	11.1	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R4年度)	4
2	大磯川7号橋	笠岡駅今井線	笠岡市笠岡	不明		2.3	3.9	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	つる橋	五番町入江線	笠岡市五番町	不明		6.7	16	1	BOX		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	かっこう橋	五番町入江線	笠岡市六番町	不明		6.3	15.8	1	BOX		2019	B	Ⅱ	○					○						
1	はまゆう橋	五番町入江線	笠岡市九番町	不明		6.6	16.8	2	BOX		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	はこべ橋	五番町入江線	笠岡市九番町	不明		13.6	17	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	不老川1号橋(宮前橋)	岡田浅海線	笠岡市甲弩	不明		6.55	4.15	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○		●			○				断面修復	1
2	甲弩4号橋	甲弩中央薬師線	笠岡市甲弩	不明		2	8.6	1	BOX		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	井立川14号橋	甲弩中央薬師線	笠岡市甲弩	不明		3.3	33.3	1	BOX		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	浅香川2号橋	甲弩中央薬師線	笠岡市走出	不明		8.4	10.1	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				補修済み(H30年度)	1
2	浅香川9号橋	走出中央線	笠岡市走出	不明		4.15	5.6	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	牛賀美川1号橋	走出中央線	笠岡市走出	不明		3.4	5.3	1	石橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	山口14号橋	山口井立線	笠岡市山口	不明		2.1	3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	長迫川28号橋	上長迫走出線	笠岡市新賀	不明		6	4.1	1	BOX		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	大谷川2号橋	上長迫走出線	笠岡市走出	不明		3.3	2.1	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	走出2号橋	上長迫走出線	笠岡市走出	不明		2.6	4.5	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	下池川1号橋	上田頭上長迫線	笠岡市小平井	不明		2	2.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
1	東大戸1号橋	助実門田線	笠岡市東大戸	不明		11.2	5.4	1	RC橋	跨道	2019	C	Ⅲ	○	●				○					一部補修済み(H29年度：10百万円) 下部工ひび割れ補修	0.5
1	用之江川5号橋(山野屋橋)	吉浜有田線	笠岡市吉浜	不明		11.7	4.4	3	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				補修済み(R2年度)	1
2	有田7号橋	吉浜有田線	笠岡市有田	不明		2.4	4.1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	犬塚川1号橋	吉浜有田線	笠岡市有田	不明		3.4	5.5	1	RC橋		2021	C	Ⅱ			○					○				
1	大河川1号橋(八千代橋)	金浦用之江線	笠岡市吉浜	不明		11.1	7.9	2	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
1	万世橋	金浦用之江線	笠岡市吉浜	1963	61	13.45	5.8	3	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
2	吉浜1号橋	金浦用之江線	笠岡市吉浜	不明		2.67	4.38	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	用之江川27号橋	用之江大迫線	笠岡市用之江	不明		3.8	5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大迫川4号橋	用之江大迫線	笠岡市有田	不明		2.8	3.5	1	石橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み(H30年度)	2
2	大迫川1号橋	用之江大迫線	笠岡市用之江	不明		2.8	4	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	吉田川47号橋	吉田鴨方線	笠岡市吉田	不明		4.7	3.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	西大島13号橋	宗国寄島線	笠岡市西大島	不明		3.3	5.7	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○	●				○			断面修復	0.3
2	石穂川4号橋	土手尻線	笠岡市西大島新田	不明		2.8	5.9	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	神島外浦1号橋	神島外浦線	笠岡市神島外浦	不明		5	1.1	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	豊浦川7号橋	大浦豊浦越線	笠岡市北木島町	不明		4.5	8	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	新賀3号橋	上長迫走出線	笠岡市新賀	不明		3	6.15	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	大明橋	上田頭上長迫線	笠岡市小平井	1991	33	11.2	6.3	1	PC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	礼場橋	石迫御嶽山線	笠岡市西大島	不明		10	3.9	1	PC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	井立川6号橋(千田下橋)	辻山手線	笠岡市甲弩	不明		4.4	6	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	浅香川5号橋	歩坪楠線	笠岡市走出	不明		3.65	5.8	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	井立川22号橋(小池橋)	歩坪楠線	笠岡市走出	不明		3.6	3.3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	長迫川2号橋	竹ノ内線	笠岡市山口	不明		10	2.5	1	PC橋		2020	C	Ⅲ		○	●				○				断面修復	1
2	八号橋	大庭井立線	笠岡市山口	1985	39	10.3	6.2	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	道万橋	岡林道万線	笠岡市尾坂	不明		8.9	4	1	PC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
2	尾坂川41号橋(石井橋)	岡林道万線	笠岡市尾坂	不明		7.6	3.5	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○					補修済み(H29年度)	5
2	尾坂川42号橋(石井谷土橋)	岡林道万線	笠岡市尾坂	不明		7	3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉田川13号橋(助実下橋)	助実追分線	笠岡市東大戸	不明		6.3	4.7	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R5年度)	1
2	生江橋	土手塩浜線	笠岡市金浦	不明		12.6	4.03	1	PC橋		2019	C	Ⅱ	○					○						
2	大昌川1号橋	土手尻唐井線	笠岡市西大島	不明		4.7	4.1	1	RC橋		2020	M	Ⅱ		○					○					

12. 橋梁　点検・修繕計画一覧表

○：点検計画
●：修繕計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2031)	(2032)	(2033)		
2	神島外浦2号橋	神島外浦中央線	笠岡市神島外浦	不明		2.2	3.8	1	石橋		2023	B	Ⅰ					○					○		
2	高須川4号橋	王泊与太郎線	笠岡市高島	不明		3	1.6	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	高須川3号橋	王泊与太郎線	笠岡市高島	不明		2.8	1.6	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	新川10号橋	鳥ノロ線	笠岡市白石島	不明		2.3	5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	鳥ノロ川1号橋	鳥ノロ線	笠岡市白石島	不明		3.4	4.1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大浦川1号橋	大飛島線	笠岡市飛島	不明		2.6	3.5	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	園井川1号橋	笠岡中央線	笠岡市園井	不明		9.4	13.3	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	相生川2号橋	笠岡中央線	笠岡市相生	不明		5	8.5	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	吉浜2号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		5	8.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
1	吉浜3号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		6	8.3	2	BOX		2019	C	Ⅱ	○					○						
2	大河川5号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		5	8.2	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	吉浜4号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		5	8.7	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜5号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		10	8.7	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	吉浜6号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		5	8.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
1	吉浜7号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		12.1	8.3	2	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜8号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		7.3	8.9	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
2	吉浜9号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		7	8.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜10号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		7	8.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜11号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		7	8.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜12号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		5	8.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜13号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		7	8.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜14号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		5	8.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜15号橋	笠岡中央線	笠岡市吉浜	不明		5	8.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	生江浜3号橋	生江浜岬線	笠岡市生江浜	2003	21	7.3	20	1	BOX		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	井立川2号橋(下原橋)	甲鷲9号山手舟村線	笠岡市甲鷲	不明		5.1	2.5	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	井立川4号橋(観音堂土橋)	甲鷲9号山手舟村線	笠岡市甲鷲	不明		5.3	2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	井立川13号橋	甲鷲9号山手舟村線	笠岡市甲鷲	不明		3.3	2.7	1	石橋		2023	B	Ⅰ					○					○		
2	井立川12号橋	甲鷲10号千田楠線	笠岡市甲鷲	不明		7.1	6.9	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	三上川1号橋	甲鷲10号千田楠線	笠岡市甲鷲	不明		2.6	7.1	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	井立川15号橋	甲鷲12号舟村線	笠岡市甲鷲	不明		3.4	2.1	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	井立川16号橋	甲鷲13号舟村線	笠岡市甲鷲	不明		3.6	7.6	1	RC橋		2021	C	Ⅲ	●1		○					○			一部補修済み(H30年度:2百万円) 断面修復、伸縮装置取替工	3.6
2	井立川17号橋	甲鷲13号舟村線	笠岡市甲鷲	不明		3	0.5	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○	補修済み(R2年度)	3
2	山淑川5号橋	甲鷲45号楠楠の上線	笠岡市甲鷲	不明		3.9	2.4	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	井立川10号橋	甲鷲63号山崎二反半田線	笠岡市甲鷲	不明		4.1	6.6	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	井立川3号橋(観音堂下橋)	甲鷲79号北畑山手線	笠岡市甲鷲	不明		4.6	4.6	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	井立川9号橋	甲鷲86号藤原屋田線	笠岡市甲鷲	不明		4.1	4.4	1	その他		2021	C	Ⅱ			○					○			補修済み(H30年度)	4
2	井立川1号橋(下橋)	甲鷲89号山手下原線	笠岡市甲鷲	不明		4.7	1	1	石橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	井立川5号橋	甲鷲90号舟橋樋詰線	笠岡市甲鷲	不明		4	1.6	1	石橋		2023	C	Ⅱ					○					○		
2	三上川2号橋	甲鷲100号岡田岡田上線	笠岡市甲鷲	不明		4.3	3.1	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	不老川2号橋	甲鷲122号岡田山手線	笠岡市甲鷲	不明		4.8	3.1	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	龍王川2号橋	甲鷲145号山手線	笠岡市甲鷲	2007	17	6.3	5	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	甲鷲3号橋	甲鷲150号山手線	笠岡市甲鷲	不明		2.7	3	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	浅香川1号橋	走出29号吉井正源寺線	笠岡市走出	不明		2.8	4	1	RC橋		2023	B	Ⅰ					○					○		
2	浅香川3号橋	走出34号吉井山廻線	笠岡市走出	不明		4	3	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R3年度)	1
2	浅香川4号橋	走出35号要害岸線	笠岡市走出	不明		4	2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	井立川18号橋	走出57号亀崎線	笠岡市走出	不明		3.2	1.3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	井立川19号橋	走出66号小池山廻線	笠岡市走出	不明		4	2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	走出3号橋	走出74号池平線	笠岡市走出	不明		2.6	2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	走出4号橋	走出78号鰹池之内線	笠岡市走出	不明		4.5	5	1	鋼橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	走出5号橋	走出82号鰹池之内線	笠岡市走出	不明		5.3	3	1	石橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
1	浅香川14号橋	走出124号浅香線	笠岡市走出	不明		5.3	1.7	2	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	浅香川13号橋	走出128号福之谷寺山線	笠岡市走出	不明		3	2.9	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	浅香川11号橋	走出131号平木伊弥ヶ市線	笠岡市走出	不明		5	3.4	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	浅香川12号橋	走出148号馬場福之谷線	笠岡市走出	不明		3	9.4	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	浅香川8号橋	走出151号平木木々名線	笠岡市走出	2008	16	4	5.5	1	BOX		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	井立川27号橋	走出151号平木木々名線	笠岡市走出	2008	16	7	6	1	BOX		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	浅香川10号橋	走出153号馬場浅香線	笠岡市走出	不明		4	3	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	井立川28号橋	走出164号井立木々名線	笠岡市走出	1985	39	8	5.8	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	大谷川4号橋	走出180号鰹池之内場ヶ所線	笠岡市走出	不明		6.6	3.6	1	RC橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	走出6号橋	走出181号中曽根場ヶ所線	笠岡市走出	不明		3.3	3.8	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	走出1号橋	走出184号池平線	笠岡市走出	不明		2.2	2.4	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	大谷川1号橋	走出185号中曽根踏込谷線	笠岡市走出	不明		6.8	1.8	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	夜燈橋	走出214号栗山井立線	笠岡市走出	1989	35	8	5.9	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	牛賀美川2号橋	走出214号栗山井立線	笠岡市走出	不明		3	4.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	井立川29号橋	走出217号栗山井立線	笠岡市走出	不明		4.2	1.8	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	走出7号橋	走出229号行司池田線	笠岡市走出	不明		2.4	2	1	石橋		2023	C	Ⅱ					○					○		
2	井立川25号橋	走出230号行司草々線	笠岡市走出	不明		2.3	7.1	1	BOX		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	浅香川7号橋	走出236号本田山田線	笠岡市走出	不明		2	4.4	1	BOX		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	井立川26号橋	走出230号行司草々線	笠岡市走出	不明		6.5	5.3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	走出8号橋	走出241号壱之坪小畑線	笠岡市走出	不明		3.3	2	1	RC橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	井立川23号橋	走出243号加屋鋤崎線	笠岡市走出	不明		3.2	2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	井立川20号橋	走出244号池田鋤崎線	笠岡市走出	不明		2.5	2.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
1	甲鷲5号橋	甲鷲9号山手舟村線	笠岡市甲鷲	不明		12	2	2	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	浅香川15号橋	走出125号浅香線	笠岡市走出	不明		3	5.8	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	走出9号橋	走出219号井立線	笠岡市走出	不明		2.2	3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	走出10号橋	走出255号井立線	笠岡市走出	不明		3	4.1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	走出11号橋	走出255号井立線	笠岡市走出	不明		3.6	4.1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	走出12号橋	走出256号中曽根場ヶ所線	笠岡市走出	不明		2	4.2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	長迫川1号橋	山口22号番田線	笠岡市山口	不明		10	2	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	長迫川4号橋	山口28号番田線	笠岡市山口	不明		10	3.3	1	PC橋		2020	C	Ⅲ		○		●1			○				PC定着部補修	1
2	長迫川3号橋	山口29号番田竹ノ内線	笠岡市山口	不明		10	3.3	1	PC橋		2020	C	Ⅲ		○		●1			○				PC定着部補修	1
2	六号橋	山口60号成藤山ノ鼻線	笠岡市山口	1983	41	13	4.7	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	七号橋	山口73号番田向山線	笠岡市山口	1984	40	12	4.7	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	長迫川10号橋	山口78号成岩野山線	笠岡市山口	不明		4.8	2.5	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	長迫川12号橋	山口78号成岩野山線	笠岡市山口	不明		5.1	3.6	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	長迫川11号橋	山口81号向山線	笠岡市山口	不明		4.9	3.8	1	鋼橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	山淑川1号橋	山口91号日近堺辺線	笠岡市山口	不明		3.4	2.6	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	山椒川4号橋	山口93号堺辺山椒谷線	笠岡市山口	不明		2.3	1.1	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	山椒川3号橋	山口97号堺辺森ヶ市線	笠岡市山口	不明		3.4	3.6	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	山口5号橋	山口102号中ノサヤ平谷線	笠岡市山口	不明		2.8	1.5	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	寺橋	山口104号番田日近線	笠岡市山口	1982	42	14	5	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	谷尻川1号橋	山口113号妹岡線	笠岡市山口	不明		9	2.1	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	谷尻川2号橋	山口114号妹岡線	笠岡市山口	不明		7	2.5	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	谷尻川6号橋	山口132号森ヶ市奥山線	笠岡市山口	不明		8	6.2	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	谷尻川9号橋	山口132号森ヶ市奥山線	笠岡市山口	不明		6	6.1	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	谷尻川10号橋	山口132号森ヶ市奥山線	笠岡市山口	不明		5	6.1	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	尾坂川19号橋(神紙橋)	山口138号成藤日近線	笠岡市山口	2013	11	12.8	4.1	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	谷尻川3号橋	山口138号成藤日近線	笠岡市山口	不明		5.4	5	1	PC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み	2
2	山口11号橋	山口144号森ヶ市線	笠岡市山口	不明		2	2.3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	谷尻川7号橋	山口149号森ヶ市線	笠岡市山口	不明		6	3	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	妹岡下橋	山口151号妹岡成藤線	笠岡市山口	1981	43	12	5	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	妹岡上橋	山口165号成藤神楽田線	笠岡市山口	不明		12	4	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	山口10号橋	山口166号森ヶ市線	笠岡市山口	不明		2.1	2.5	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	山口6号橋	山口179号神楽田線	笠岡市山口	不明		3.3	2.2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み(H30年度)	2

12. 橋梁　点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			○:点検計画 ●:修繕計画									主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)		
2	谷尻川4号橋	山口180号神楽田日近線	笠岡市山口	不明		5.5	3.2	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	山口3号橋	山口180号神楽田日近線	笠岡市山口	不明		2.6	2.6	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	森市橋	山口182号大間堺辺線	笠岡市山口	1930	94	6.1	6.4	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○	●				○				断面修復	1
2	山口4号橋	山口182号大間堺辺線	笠岡市山口	不明		2.9	7.9	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	山淑川2号橋	山口182号大間堺辺線	笠岡市山口	不明		3.4	8.1	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	山口8号橋	山口191号森ヶ市線	笠岡市山口	不明		9.4	2	1	鋼橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
1	尾坂川21号橋(雁名橋)	山口198号成藤大間線	笠岡市山口	不明		11	4.5	2	RC橋		2019	C	Ⅲ	○					○					断面修復、防護柵補修	0.8
2	山口13号橋	山口208号森ヶ市線	笠岡市山口	不明		2.5	4	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○	●				○				断面修復	0.2
2	山口9号橋	山口208号森ヶ市線	笠岡市山口	不明		2.7	4	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○	●				○			断面修復・伸縮装置取替	2
2	山口12号橋	山口208号森ヶ市線	笠岡市山口	不明		2.1	3.7	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	谷尻川8号橋	山口208号森ヶ市線	笠岡市山口	不明		7	3.1	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	長迫川17号橋	新賀28号溝ノ上宮ノ脇線	笠岡市新賀	不明		4.5	5.1	1	鋼橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	長迫川25号橋	新賀96号岩神線	笠岡市新賀	不明		2.8	3.1	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	長迫川27号橋	新賀101号岩上大津恵線	笠岡市新賀	2024	0	3.7	3.3	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	長迫川23号橋	新賀115号山之下迫之上線	笠岡市新賀	不明		4	4.4	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	長迫川21号橋	新賀116号鴨分線	笠岡市新賀	不明		5	3	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	神楽橋	新賀125号鴨分線	笠岡市新賀	1937	87	4.8	2.8	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	長迫川19号橋	新賀132号向ヶ市金黒線	笠岡市新賀	不明		4	2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	長迫川22号橋	新賀132号向ヶ市金黒線	笠岡市新賀	不明		5	5.2	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	長迫川26号橋	新賀132号向ヶ市金黒線	笠岡市新賀	不明		7.2	4.6	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	長迫川13号橋	新賀133号向ヶ市梶山線	笠岡市新賀	不明		7	6.6	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	長迫川18号橋	新賀135号向ヶ市青景線	笠岡市新賀	不明		4	3.1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み(H30年度)	2
2	長迫川15号橋	新賀151号宮ノ脇線	笠岡市新賀	不明		4.2	1.9	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	長迫川16号橋	新賀152号宮ノ脇線	笠岡市新賀	不明		4.2	9.3	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	尾坂川22号橋(地頭崎橋)	新賀165号雁名神子免線	笠岡市新賀	不明		9.9	2	1	PC橋		2019	C	Ⅲ	○		●			○					断面修復	0.3
1	尾坂川25号橋	新賀224号山下大間線	笠岡市新賀	不明		10.6	6.5	2	RC橋		2019	C	Ⅲ	○					○					補修済み(R4年度)	11
2	長迫川19-1号橋	新賀225号鴨分線	笠岡市新賀	不明		3	7.2	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	長迫川24号橋	新賀79号岩神大ナル線	笠岡市新賀	不明		4	8.7	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	新山橋	山口214号成藤森ヶ市線	笠岡市山口	1987	37	10	8.6	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	一本橋	山口215号香田木々名線	笠岡市山口	1998	26	11	10	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	尾坂1号橋	尾坂21号北山線	笠岡市尾坂	不明		11	1	1	鋼橋		2020	C	Ⅲ		○					○				同年度点検後補修済み(R2年度)	4
2	尾坂川43号橋(竜王橋)	尾坂25号石井谷北山線	笠岡市尾坂	不明		7	3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	尾坂4号橋(左ヶ谷橋)	尾坂16号北山線	笠岡市尾坂	不明		4	3.3	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	北山川1号橋(北山橋)	尾坂25号石井谷北山線	笠岡市尾坂	不明		4	3.3	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	北山川2号橋(北山上橋)	尾坂25号石井谷北山線	笠岡市尾坂	不明		3	3.3	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○					○			補修済み(R4年度)	1
2	尾坂川40号橋(小谷迫橋)	尾坂32号小谷迫龍王線	笠岡市尾坂	不明		7.1	2	1	木橋		2023	C	Ⅲ					○					○	補修済み(R2年度)	2
2	尾坂川38号橋(隠し迫橋)	尾坂44号隠し迫石塔端線	笠岡市尾坂	不明		9	5.2	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				同年度点検後補修済み(R2年度)	3
2	尾坂川37号橋(山ノ神橋)	尾坂50号山ノ神船ヶ迫線	笠岡市尾坂	不明		8	2.6	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R4年度)	2
2	尾坂川36号橋(大塚橋)	尾坂82号山ノ神大塚線	笠岡市尾坂	不明		7	2	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	尾坂川34号橋(下神橋)	尾坂84号下神土井前線	笠岡市尾坂	不明		10.2	3	1	PC橋		2019	C	Ⅲ	○		●			○					断面修復	1.5
1	尾坂川33号橋(仁後谷橋)	尾坂87号八重堰仁後谷線	笠岡市尾坂	不明		10	3.2	2	RC橋		2019	C	Ⅲ	○		●			○					ひび割れ補修・断面修復	8
2	尾坂川32号橋(山下橋)	尾坂89号山下宗広線	笠岡市尾坂	不明		7	3	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	尾坂川31号橋(岡林橋)	尾坂93号宗広山下線	笠岡市尾坂	不明		7	3	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	尾坂川35号橋(川角橋)	尾坂101号山崎仁後谷線	笠岡市尾坂	不明		8	5.3	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	荒神川1号橋	尾坂123号掛抜金井線	笠岡市尾坂	不明		2	2.6	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	尾坂川30号橋	尾坂138号西谷川原田線	笠岡市尾坂	不明		6	4.4	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	尾坂2号橋	尾坂143号岡林一寸坂線	笠岡市尾坂	不明		3.3	1.5	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	小原井川1号橋	尾坂144号八通り妙見谷線	笠岡市尾坂	不明		4	4	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	尾坂3号橋	尾坂144号八通り妙見谷線	笠岡市尾坂	不明		3	4.7	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	小原井川2号橋	尾坂149号平惣小原井線	笠岡市尾坂	不明		2.8	3.1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	尾坂川28号橋(関戸上橋)	関戸9号上河内山之河内線	笠岡市関戸	不明		9.8	3.4	1	PC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
1	尾坂川27号橋	関戸12号平井上沖線	笠岡市関戸	不明		11	4.5	2	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				補修済み(R1年度)	4.5
2	尾坂川26号橋(樋治屋橋)	関戸16号下河内線	笠岡市関戸	不明		10.5	3.4	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	尾坂川29号橋(青平橋)	関戸19号山津良岩崎線	笠岡市関戸	不明		11.1	2.6	1	PC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R3年度)	2
2	関戸1号橋	関戸25号向原猪迫線	笠岡市関戸	不明		3.2	3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大野呂川2号橋	関戸34号山本中池田線	笠岡市関戸	不明		2	1.4	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	大野呂川3号橋(祝部橋)	関戸35号向原唐臼線	笠岡市関戸	不明		3.4	4.9	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大野呂川4号橋(上沖橋)	関戸39号鷲田八幡線	笠岡市関戸	不明		2.6	4.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大野呂川5号橋	関戸40号上沖猪迫線	笠岡市関戸	不明		3	3.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	吉田川25号橋(山中橋)	吉田58号山中線	笠岡市吉田	不明		5.1	2.1	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川24号橋(山中下橋)	吉田60号山中大塚線	笠岡市吉田	不明		3.7	2.2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				補修済み(H30年度)	1
2	吉田川29号橋	吉田62号吉川大野路線	笠岡市吉田	1997	27	9.4	6.8	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	大野呂川6号橋	吉田62号吉川大野路線	笠岡市吉田	不明		2.2	7.9	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川26号橋(大塚橋)	吉田71号中曽祢田平線	笠岡市吉田	2018	6	7	5.2	1	PC橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	吉田川27号橋(田平橋)	吉田75号中曽祢田平線	笠岡市吉田	不明		9	4.8	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	田平川1号橋(田平下橋)	吉田75号中曽祢田平線	笠岡市吉田	不明		3	7.9	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○					○			補修済み(R3年度)	1
2	田平川2号橋(田平上橋)	吉田77号田平線	笠岡市吉田	不明		4	3.6	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	吉田1号橋	吉田77号田平線	笠岡市吉田	不明		2.9	6.4	1	RC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	吉田川28号橋(山ノ神橋)	吉田79号山ノ神田平線	笠岡市吉田	1996	28	6.7	6	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	田平川3号橋	吉田80号藤平池尻線	笠岡市吉田	不明		3	4.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	田平川4号橋(池尻橋)	吉田89号池尻龍王線	笠岡市吉田	不明		4	3.7	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	吉田2号橋	吉田93号藤平龍王線	笠岡市吉田	不明		2.2	4.6	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大野呂川7号橋	吉田119号龍王山手線	笠岡市吉田	不明		2.4	3.6	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大野呂川8号橋	吉田119号龍王山手線	笠岡市吉田	不明		2	8.4	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○					○			補修済み(R4年度)	1
2	吉田川32号橋	吉田192号堀之内鍛冶屋線	笠岡市吉田	不明		9.2	3.8	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川30号橋(赤岸橋)	吉田194号原藤之木線	笠岡市吉田	不明		6.5	2.8	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	吉田川31号橋(原橋)	吉田199号原線	笠岡市吉田	不明		11.2	4.2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川33号橋(前橋)	吉田207号前吉川線	笠岡市吉田	1994	30	8.2	6.2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田3号橋	吉田222号惣原線	笠岡市吉田	不明		2	2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	吉田川35号橋	吉田264号鍛冶屋線	笠岡市吉田	不明		7.5	2.8	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川34号橋(宮地橋)	吉田265号南宮地線	笠岡市吉田	不明		9	5.2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川37号橋	吉田268号宮地線	笠岡市吉田	不明		5.6	4.6	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川36号橋	吉田273号宮地鍛冶屋線	笠岡市吉田	不明		8.6	4.2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川38号橋(下池橋)	吉田278号迫宮地線	笠岡市吉田	不明		3.3	6.5	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	吉田川39号橋(上池橋)	吉田279号宮地周津線	笠岡市吉田	不明		7	3.3	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	吉田川40号橋	吉田282号新入平木線	笠岡市吉田	不明		4.2	3.2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川43号橋	吉田284号新入高折線	笠岡市吉田	不明		4.5	8.8	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川41号橋(周津橋)	吉田286号新入周津線	笠岡市吉田	不明		6	2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	吉田川42号橋	吉田289号高折周津線	笠岡市吉田	不明		4.6	6.4	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川44号橋	吉田292号狐岩新入線	笠岡市吉田	不明		3.4	2.1	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	関戸2号橋	関戸91号八幡線	笠岡市関戸	不明		2.9	3.3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	田平川6号橋	吉田79号山ノ神田平線	笠岡市吉田	不明		4	5.8	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	吉田川45号橋	吉田54号山中大塚線	笠岡市吉田	1996	28	7.9	5.5	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	小原井川3号橋	尾坂149号平惣小原井線	笠岡市尾坂	不明		5	7.3	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	立石川2号橋	小平井39号皿池尻線	笠岡市小平井	不明		7.6	2.5	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
3	吉田川23号橋(立石上橋)	小平井43号仁五谷向原線	笠岡市小平井	不明		5.6	1	1	木橋		2023	C	Ⅲ					○					○	集約化撤去予定	
2	吉田川20号橋(大明神橋)	小平井53号立石明神線	笠岡市小平井	不明		8.4	1.5	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	下池川2号橋	小平井59号歪原線	笠岡市小平井	不明		2.7	5.7	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	吉田川19号橋(大崎橋)	小平井78号山崎仕山線	笠岡市小平井	不明		8.7	4.6	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	立石川1号橋	小平井122号道平向原線	笠岡市小平井	不明		3.2	4.2	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	向原橋	小平井122号道平向原線	笠岡市小平井	1991	33	10.7	4.8	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川18号橋(大力橋)	小平井123号馬橋ノ上住山線	笠岡市小平井	不明		9.4	3	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R3年度)	1
2	吉田川15号橋(門戸橋)	小平井133号馬橋ノ下井堰ノ上線	笠岡市小平井	不明		10.3	3.3	1	PC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
3	吉田川16号橋(門戸上橋)	小平井135号馬門戸橋ノ下線	笠岡市小平井	不明		9.1	1.2	1	鋼橋		2020	C	Ⅲ		○					○				集約化撤去予定	

12. 橋梁　点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			○：点検計画 ●：修繕計画									主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)		
2	吉田川17号橋(馬場下橋)	小平井137号道平門戸線	笠岡市小平井	不明		7.6	3.6	1	PC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				同年度点検後補修済み(R2年度)	1
2	東大戸3号橋	東大戸90号猪頭岡林線	笠岡市東大戸	不明		4.1	3	1	PC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	吉田川14号橋(助実橋)	東大戸107号長町線	笠岡市東大戸	不明		6.8	3	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	吉田川12号橋(首くぐり橋)	東大戸121号田中平線	笠岡市東大戸	不明		8.6	2.3	1	鋼橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R3年度)	1
2	西の谷川1号橋(辻橋)	東大戸132号ニタ川辻線	笠岡市東大戸	不明		6.8	6.8	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	西の谷川2号橋	東大戸134号霜田松ノ前線	笠岡市東大戸	不明		10	4.2	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	天神橋	東大戸157号仁後中川線	笠岡市東大戸	1912	112	4	4.4	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	大持川2号橋	東大戸165号天神山横路線	笠岡市東大戸	不明		4.5	5	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	大持川3号橋	東大戸169号畷甕ノ尾線	笠岡市東大戸	不明		3.5	1.2	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
1	東大戸5号橋	東大戸175号清水上田渡り向線	笠岡市東大戸	不明		10.6	4.3	1	PC橋	跨道	2019	A	Ⅰ	○					○					補修済み(H29年度)	8
2	西の谷川4号橋(田遊橋)	東大戸219号田遊道ノ崎線	笠岡市東大戸	不明		7.7	4.1	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
1	東大戸6号橋	東大戸233号大山笹山線	笠岡市東大戸	不明		10	4.5	1	PC橋	跨道	2019	A	Ⅰ	○					○					補修済み(H29年度)	4
2	西の谷川5号橋(道ノ崎橋)	東大戸243号平大池ノ谷線	笠岡市東大戸	不明		8.6	4.1	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	東大戸7号橋	東大戸265号追泉線	笠岡市東大戸	不明		2.2	1.5	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	矢立川1号橋	西大戸7号場徳原鳴渕線	笠岡市西大戸	不明		4.2	4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
1	東大戸8号橋	東大戸175号清水上田渡り向線	笠岡市東大戸	不明		11.7	3.8	1	PC橋	跨道	2019	C	Ⅲ	○					○					補修済み(H29年度：5百万円) 補修済み(R5年度：5百万円)	10
2	矢立川12号橋	西大戸76号明賀矢立線	笠岡市西大戸	不明		7.8	6.5	1	BOX		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	矢立川11号橋	西大戸77号王蔵給線	笠岡市西大戸	不明		4.2	9	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	矢立川10号橋	西大戸78号裸鍵鋳谷線	笠岡市西大戸	不明		3.7	3	1	RC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	矢立川9号橋	西大戸78号裸鍵鋳谷線	笠岡市西大戸	不明		4.6	4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	矢立川6号橋	西大戸79号迫之峠鳴渕線	笠岡市西大戸	不明		4.4	3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	矢立川5号橋	西大戸79号迫之峠鳴渕線	笠岡市西大戸	不明		6.5	3	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	矢立川8号橋	西大戸80号鳴渕線	笠岡市西大戸	不明		5.2	3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	矢立川7号橋	西大戸80号鳴渕線	笠岡市西大戸	不明		4.2	8.1	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	西の谷川8号橋	東大戸199号尾無大山線	笠岡市東大戸	不明		3.1	10	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉田川46号橋	小平井251号道平線	笠岡市小平井	不明		9.6	8.7	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	篠坂4号橋	篠坂1号熊口線	笠岡市篠坂	不明		5.9	3.8	1	石橋		2023	C	Ⅱ					○					○		
2	篠坂1号橋	篠坂4号カシヤ迫佐山線	笠岡市篠坂	不明		2	2.2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	篠坂川1号橋	篠坂4号カシヤ迫佐山線	笠岡市篠坂	不明		4.7	2.6	1	BOX		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	篠坂3号橋	篠坂5号三歩一清迫線	笠岡市篠坂	不明		2.1	2.7	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	篠坂5号橋	篠坂34号妙池十二ヶ谷線	笠岡市篠坂	不明		4.3	5.1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	篠坂川5号橋	篠坂67号中ノ坊畔地線	笠岡市篠坂	不明		2.2	2.7	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	篠坂川6号橋	篠坂71号堂ノ上東大坊東線	笠岡市篠坂	不明		3.2	3	1	PC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	篠坂川3号橋	篠坂147号小迫大戸原線	笠岡市篠坂	不明		2.5	2	1	PC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	入田1号橋	入田86号宮脇塚仁後線	笠岡市入田	不明		2.5	3.9	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	寺谷川4号橋	有田28号常時前畑谷線	笠岡市有田	不明		2.5	3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	寺谷川5号橋	有田28号常時前畑谷線	笠岡市有田	不明		2.7	3.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大迫川3号橋	有田76号花畑香屋谷線	笠岡市有田	不明		2.5	3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大迫川7号橋	有田89号惣津池下線	笠岡市有田	不明		3.3	0.7	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	大迫川6号橋	有田93号惣津池下才ノ峠線	笠岡市有田	不明		5.8	2.3	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	大迫川5号橋	有田96号国広花畑線	笠岡市有田	不明		3.4	8.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大迫川2号橋	有田98号下個岡惣上線	笠岡市有田	不明		2.5	1.5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	有田川8号橋(大迫橋)	有田108号個岡惣下鳥居前線	笠岡市有田	不明		4	4.3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	有田川9号橋(鳥居前橋)	有田111号北畑鳥居前線	笠岡市有田	不明		4	1.9	1	石橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	犬塚川2号橋	有田122号礎田下ノ尾線	笠岡市有田	不明		3.4	3.2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	犬塚川3号橋	有田126号竜王後内山西線	笠岡市有田	不明		2.3	3	1	BOX		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	犬塚川4号橋	有田127号内山東下ノ尾線	笠岡市有田	不明		2.4	16.3	1	BOX		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	犬塚川7号橋	有田145号カヤ原池下線	笠岡市有田	不明		2.4	2.5	1	RC橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	犬塚川8号橋	有田151号西谷迫内山東線	笠岡市有田	不明		3	3.7	1	RC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	有田川6号橋(西チヲ大橋)	有田152号新涯川南犬塚線	笠岡市有田	不明		4	1.2	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	犬塚川6号橋	有田158号カヤ原池下犬塚線	笠岡市有田	不明		2.4	3	1	PC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	篠坂川7号橋	篠坂104号堂ノ下小森線	笠岡市篠坂	不明		3.8	3.5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	篠坂6号橋	篠坂153号福井立花線	笠岡市篠坂	不明		2.6	8.5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	入田2号橋	入田117号天神後下フケ線	笠岡市入田	不明		3.8	4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	入田3号橋	入田118号天神後下フケ線	笠岡市入田	不明		3.8	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大迫川10号橋	有田193号大畑小丸山線	笠岡市有田	不明		2.4	1.8	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	篠坂川8号橋	篠坂163号諏訪下福井線	笠岡市篠坂	不明		3.3	5	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	用之江2号橋	用ノ江24号森城山線	笠岡市用之江	不明		3	1.5	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	用之江川21号橋	用之江65号万福寺後浜ノ内線	笠岡市用之江	不明		4.8	5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み(H30年度)	2
2	用之江川26号橋	用ノ江69号金正線	笠岡市用之江	不明		4	3.7	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	用之江川25号橋	用ノ江69号金正線	笠岡市用之江	不明		3.5	3.5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	用之江川23号橋	用ノ江83号天神端線	笠岡市用之江	不明		3.8	1.5	1	石橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	用之江川24号橋	用ノ江84号万福寺深田上線	笠岡市用之江	不明		2.2	4	1	石橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	用之江川20号橋	用ノ江98号浜之内線	笠岡市用之江	不明		3	1.3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	用之江川22号橋	用ノ江99号万福寺浜之内線	笠岡市用之江	不明		5.2	19.8	1	RC橋		2022	C	Ⅲ				●	○				○		断面修復	2
2	用之江6号橋	用之江102号城後田唐松山線	笠岡市用之江	不明		2.3	2	1	RC橋		2022	B	Ⅰ					○					○		
1	用之江5号橋	用ノ江109号池迫線	笠岡市用之江	不明		4.4	1.8	2	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	用之江川18号橋	大宜10号浜川塩浜線	笠岡市大宜	不明		4	3.4	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○	補修済み(R4年度)	2
2	用之江川19号橋	大宜13号場辺志羽子線	笠岡市大宜	不明		5	3.5	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	本谷川3号橋	大宜43号本谷羽迫線	笠岡市大宜	不明		3.1	6.3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	本谷川4号橋	大宜45号椿ノ木畦前線	笠岡市大宜	不明		2	1	1	PC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	本谷川1号橋	大宜73号本谷岩崎線	笠岡市大宜	不明		3.2	3.7	1	BOX		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大宜5号橋	大宜84号田中谷僧谷線	笠岡市大宜	不明		3.3	3.4	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大宜2号橋	大宜85号小迫線	笠岡市大宜	不明		3.6	3.6	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	本谷川2号橋	大宜113号畦ノ峠本谷線	笠岡市大宜	不明		2	4	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	茂平1号橋	茂平6号野上吉無線	笠岡市茂平	不明		2.8	4.3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	茂平2号橋	茂平77号坂里西吉原線	笠岡市茂平	不明		2.3	3.1	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	砂川10号橋	茂平98号蒼績琴迫線	笠岡市茂平	不明		3.1	1.2	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	砂川8号橋	茂平98号蒼績琴迫線	笠岡市茂平	不明		3.9	3.6	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	砂川9号橋	茂平101号蒼績矢ノ平線	笠岡市茂平	不明		3.6	3.7	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	砂川7号橋	茂平114号東郷旗遥地線	笠岡市茂平	不明		3	3.95	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	砂川6号橋	茂平116号東郷旗遥地線	笠岡市茂平	不明		3.1	6.3	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	砂川5号橋	茂平117号東郷尾越線	笠岡市茂平	不明		3.1	7.1	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	砂川4号橋	茂平120号東郷矢ノ平線	笠岡市茂平	不明		3.2	2	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	砂川3号橋	茂平125号矢ノ平線	笠岡市茂平	不明		3.1	4.2	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	砂川2号橋	茂平126号東郷水落線	笠岡市茂平	不明		2.6	2.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	茂平3号橋	茂平135号長瀬線	笠岡市茂平	不明		3.1	13.6	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	砂川1号橋	茂平129号長瀬線	笠岡市茂平	不明		7	4.6	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	本谷川5号橋	大宜47号小谷正月山線	笠岡市大宜	不明		2.5	5.3	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					2
1	長瀬橋	茂平142号長瀬線	笠岡市茂平	1989	35	11.2	14.88	2	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	相生川3号橋	相生47号ハナ第壱号線	笠岡市相生	不明		2.6	10.1	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	相生川4号橋	相生48号ハナ第壱号線	笠岡市相生	不明		2.8	2	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	相生川5号橋	相生63号孫右エ門バナ宮ノ前第壱号線	笠岡市相生	不明		3	2.8	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	木之目川1号橋	相生65号孫右エ門バナ線	笠岡市相生	不明		3	2.3	1	BOX		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	吉田川2号橋(新川橋)	金浦20号古新開新川平線	笠岡市金浦	不明		12.9	1.8	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	大明神川3号橋	金浦67号奥山地方線	笠岡市金浦	不明		2	6.8	1	石橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	大明神川5号橋	金浦83号川地地方線	笠岡市金浦	不明		2.6	1.1	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	大明神川4号橋	金浦84号地方大谷線	笠岡市金浦	不明		2	3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	金浦3号橋	金浦92号町分沖線	笠岡市金浦	不明		3	6.5	1	石橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	大明神川1号橋	金浦92号町分沖線	笠岡市金浦	不明		4.1	4.3	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○					補修済み(H29年度)	4
2	大明神川2号橋	金浦113号沖線	笠岡市金浦	不明		3	7.3	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	田方沖橋	金浦116号地方線	笠岡市金浦	不明		3.2	4	1	PC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大河1号橋	大河81号当摩線	笠岡市大河	不明		3.5	2.4	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大河川8号橋	吉浜4号井出池尻壱号線	笠岡市吉浜	不明		4	3	1	BOX		2022	B	Ⅱ				○					○			

12. 橋梁　点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			○：点検計画 ●：修繕計画									主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)		
2	大河川7号橋	吉浜6号井出池尻壱号迫壱号線	笠岡市吉浜	不明		3.8	4.7	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜18号橋	吉浜6号井出池尻壱号迫壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.5	7.5	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	吉田川9号橋(河中屋橋)	吉浜11号井出池尻壱号鐙壱号線	笠岡市吉浜	不明		11.3	2.2	1	鋼橋		2020	C	Ⅱ		○					○				補修済み(R3年度)	1
1	吉田川6号橋(笹賀屋橋)	吉浜21号樋鐙壱号線	笠岡市吉浜	不明		14	1.8	5	石橋		2023	E	Ⅳ					○					○	通行止め	
2	吉田川5号橋	吉浜22号鐙壱号線	笠岡市吉浜	不明		9.4	2.2	1	鋼橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	相生川1号橋	吉浜24号鐙壱号線	笠岡市吉浜	不明		5.6	5.4	1	BOX		2020	A	Ⅰ		○					○					
1	大河川6号橋	吉浜33号當摩壱号安原壱号線	笠岡市吉浜	不明		5	4.5	2	石橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	新池水路12号橋	吉浜47号迫壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.2	7	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	新池水路11号橋	吉浜49号迫壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.1	0.4	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	吉浜20号橋	吉浜51号迫壱号安原壱号線	笠岡市吉浜	不明		3.3	5.4	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	新池水路10号橋	吉浜58号迫壱号線	笠岡市吉浜	不明		3.2	4.1	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	吉浜7号橋	吉浜62号安原壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.7	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	新池水路8号橋	吉浜64号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.3	6.3	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○		補修済み(H30年度)	2
2	新池水路7号橋	吉浜68号松川壱号中郷壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.5	3.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	新池水路6号橋	吉浜70号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.1	0.8	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	新池水路5号橋	吉浜73号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		2	3	1	BOX		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	新池水路4号橋	吉浜76号中郷壱号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		2	5.4	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	新池水路2号橋	吉浜77号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		2	4	1	BOX		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	吉浜21号橋	吉浜84号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		2	2.3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	新池水路1号橋	吉浜85号松川壱号中郷壱号線	笠岡市吉浜	不明		2	3	1	BOX		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	吉浜24号橋	吉浜65号松川壱号中郷壱号線	笠岡市吉浜	不明		2	4	1	BOX		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	吉浜25号橋	吉浜96号銀山壱号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.2	3	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉浜26号橋	吉浜99号銀山壱号西郷壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.5	3.3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	有田川1号橋	吉浜113号西郷壱号上ノ町壱号線	笠岡市吉浜	2020	4	5.6	2	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	用之江川10号橋	吉浜113号西郷壱号上ノ町壱号線	笠岡市吉浜	不明		6	3.1	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	吉浜28号橋	吉浜114号上ノ町壱号狐崎壱号線	笠岡市吉浜	不明		5	8.3	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
1	吉浜29号橋	吉浜116号上ノ町壱号狐崎三号線	笠岡市吉浜	不明		10	2	4	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
1	有田川3号橋(狐崎橋)	吉浜118号上ノ町壱号塩浜壱号線	笠岡市吉浜	不明		10	3.3	2	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	有田川4号橋(狐崎上橋)	吉浜119号銀山壱号狐崎三号線	笠岡市吉浜	2015	9	5.3	2	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	用之江川14号橋	吉浜138号塩浜壱号線	笠岡市吉浜	不明		4	6	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	用之江川15号橋	吉浜139号塩浜壱号線	笠岡市吉浜	不明		4	1.7	1	石橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	用之江川11号橋	吉浜144号塩浜壱号上ノ町壱号線	笠岡市吉浜	不明		4.3	1.7	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	用之江川9号橋	吉浜150号西郷壱号線	笠岡市吉浜	不明		3.8	1.6	1	鋼橋		2022	C	Ⅱ				○					○			
1	用之江川7号橋	吉浜153号西郷壱号線	笠岡市吉浜	不明		4.8	2.5	2	石橋		2022	C	Ⅲ			●	○					○		塗装、下部工補修、一部補修済み(R1年度)	1.3
2	用之江川6号橋	吉浜155号船隠壱号塩浜壱号線	笠岡市吉浜	不明		5.52	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	用之江川13号橋	吉浜155号船隠壱号塩浜壱号線	笠岡市吉浜	不明		4.2	1.7	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	吉浜23号橋	吉浜161号中郷壱号線	笠岡市吉浜	不明		3.8	4	1	BOX		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	用之江川4号橋	吉浜162号宮ノ前壱号松川壱号線	笠岡市吉浜	2007	17	10	3	1	鋼橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
1	吉浜30号橋	吉浜162号宮ノ前壱号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.1	3.2	2	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉浜31号橋	吉浜162号宮ノ前壱号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		3.1	3.1	1	BOX		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	新池水路3号橋	吉浜162号宮ノ前壱号松川壱号線	笠岡市吉浜	不明		2	5.5	1	BOX		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	用之江川3号橋(渡橋)	吉浜164号宮ノ前壱号安原壱号線	笠岡市吉浜	不明		9.1	2	1	鋼橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	吉浜2号橋	吉浜164号宮ノ前壱号安原壱号線	笠岡市吉浜	不明		4	8.3	1	BOX		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	吉浜16号橋	吉浜164号宮ノ前壱号安原壱号線	笠岡市吉浜	不明		3.7	3.1	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	大河川3号橋	吉浜164号宮ノ前壱号安原壱号線	笠岡市吉浜	不明		5.8	3.1	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	吉浜32号橋	吉浜165号安原壱号當摩壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.5	3	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	大河川2号橋	吉浜165号安原壱号當摩壱号線	笠岡市吉浜	不明		9.9	4.6	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	大河川4号橋(当摩橋)	吉浜167号安原壱号當摩壱号線	笠岡市吉浜	不明		5.7	2.1	1	BOX		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜33号橋	吉浜190号船隠壱号線	笠岡市吉浜	不明		4.3	3.8	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	吉浜34号橋	吉浜208号西郷壱号線	笠岡市吉浜	不明		5.6	3	1	石橋		2022	C	Ⅲ		●		●	○	●				○		改築予定	8.5
2	生江浜1号橋	生江浜19号土手之内北山線	笠岡市生江浜	不明		2.8	3.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○						○			
2	生江浜2号橋	生江浜19号土手之内北山線	笠岡市生江浜	不明		2.5	6.6	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○						○			
2	辻橋	大河1号吉岡線	笠岡市大河	不明		7	3.5	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	矢立川4号橋	大河123号吉岡線	笠岡市大河	不明		4.4	5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	矢立川3号橋	大河124号吉岡線	笠岡市大河	不明		4.7	16.6	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	新池水路13号橋	吉浜51号迫壱号安原壱号線	笠岡市吉浜	不明		2.2	6	1	BOX		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	新池水路14号橋	吉浜61号中郷壱号迫壱号線	笠岡市生江浜	不明		2.2	6	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	生江浜4号橋	生江浜57号沖浦中島線	笠岡市生江浜	不明		2	4.4	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
1	隅田川19号橋	笠岡16号鳶ノ子線	笠岡市笠岡	不明		4	3.3	2	石橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	隅田川18号橋	笠岡20号鳶ノ子線	笠岡市笠岡	不明		3	2.8	1	RC橋		2023	C	Ⅲ				●	○					○		断面修復	1.5
2	笠岡5号橋	笠岡29号線下谷田頭線	笠岡市笠岡	不明		2.3	2.9	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	笠岡7号橋	笠岡43号線下谷頭線	笠岡市笠岡	不明		2.2	7	1	BOX		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	隅田川15号橋	笠岡44号線下谷頭線	笠岡市笠岡	不明		3	1.3	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	隅田川17号橋	笠岡46号線下谷頭線	笠岡市笠岡	不明		2.4	1	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	隅田川14号橋	笠岡63号ミノ内田頭線	笠岡市笠岡	不明		5.1	4.3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	笠岡4号橋	笠岡74号大久保田頭線	笠岡市笠岡	不明		2.5	1.5	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	笠岡8号橋	笠岡85号田頭線	笠岡市笠岡	不明		4.3	2	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	隅田川10号橋	笠岡116号八幡平堂上線	笠岡市笠岡	不明		2.5	6.2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				補修済み(H30年度)	1
2	隅田川9号橋	笠岡117号川辺屋町線	笠岡市笠岡	不明		4.6	5	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R4年度)	1
2	隅田川8号橋(辻川橋)	笠岡117号川辺屋町線	笠岡市笠岡	1953	71	3.7	3.1	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	隅田川7号橋	笠岡123号川辺屋町堂上線	笠岡市笠岡	不明		4.27	4.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	称念寺橋	笠岡125号西本町線	笠岡市笠岡	不明		5.2	5.7	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
1	隅田川4号橋	笠岡127号西本町線	笠岡市笠岡	不明		6.8	3	2	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	隅田川3号橋(平安橋)	笠岡128号西ノ浜絵下谷線	笠岡市笠岡	1988	36	9.2	5.3	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	笠岡3号橋	笠岡128号西ノ浜絵下谷線	笠岡市笠岡	不明		2	3.6	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	隅田川6号橋	笠岡128号西ノ浜絵下谷線	笠岡市笠岡	不明		5.1	4.1	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	笠岡6号橋	笠岡128号西ノ浜絵下谷線	笠岡市笠岡	不明		3	4.2	1	RC橋		2022	E	Ⅲ			●	●	○					○		ひび割れ補修	2
2	隅田川2号橋(西ノ浜橋)	笠岡165号西ノ浜新田西ノ浜新開地線	笠岡市笠岡	不明		10.6	5.2	1	PC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	笠岡10号橋	笠岡173号西ノ浜西ノ浜新開地線	笠岡市笠岡	不明		2.9	7.7	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	笠岡11号橋	笠岡177号西ノ浜新開地西ノ浜線	笠岡市笠岡	不明		3.3	8.3	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	馬飼川3号橋	笠岡185号馬飼越線	笠岡市笠岡	不明		2.2	3.4	1	PC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	馬飼川4号橋	笠岡190号馬飼越線	笠岡市笠岡	不明		2.1	1	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	宮地川4号橋	笠岡310号宮地南平線	笠岡市笠岡	不明		5	3	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	笠岡12号橋	笠岡325号伏越大磯線	笠岡市笠岡	不明		2	3.1	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	応神川7号橋	笠岡337号大磯線	笠岡市笠岡	不明		3.8	3.3	1	RC橋		2022	C	Ⅲ				○					○		補修済み(R4年度)	2
2	笠岡13号橋	笠岡345号大磯線	笠岡市笠岡	不明		3.15	3.55	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	大磯川6号橋	笠岡348号大磯線	笠岡市笠岡	不明		3.8	4	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	すずめ橋	番町1号五番町一番町線	笠岡市五番町	不明		3.6	7.3	1	RC橋		2019	C	Ⅲ	○		●			○					断面修復	0.7
2	きじ橋	番町1号五番町一番町線	笠岡市四番町	不明		3.6	7.2	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	れんげ橋	番町1号五番町一番町線	笠岡市三番町	不明		3.6	7.2	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	きく橋	番町1号五番町一番町線	笠岡市三番町	不明		3.5	7.2	1	RC橋		2019	C	Ⅲ	○		●			○					断面修復	0.7
2	いちょう橋	番町1号五番町一番町線	笠岡市二番町	不明		3.6	7.2	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	はと橋	番町3号五番町線	笠岡市五番町	不明		3.6	5.6	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
1	つばめ橋	番町4号十一番町十番町線	笠岡市十一番町	不明		6.8	12.6	2	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	もず橋	番町6号五番町二番町線	笠岡市五番町	不明		3.6	9.7	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	めじろ橋	番町6号五番町二番町線	笠岡市六番町	不明		4.8	9.6	1	RC橋		2019	B	Ⅱ	○					○						
2	ずみれ橋	番町6号五番町二番町線	笠岡市三番町	不明		3.6	9.7	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
2	ばら橋	番町6号五番町二番町線	笠岡市二番町	不明		3.6	9.6	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
2	こまどり橋	番町14号十一番町線	笠岡市十一番町	不明		9.4	9	1	PC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	うぐいす橋	番町20号四番町線	笠岡市四番町	不明		3.6	5.6	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○						
2	ひばり橋	番町22号四番町線	笠岡市四番町	不明		4.6	5.6	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
2	はぎ橋	番町26号三番町十一番町線	笠岡市九番町	不明		13	5.6	1	PC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
2	かえで橋	番町28号一番町十一番町線	笠岡市一番町	不明		13	8.3	1	PC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
2	けやき橋	番町29号一番町三番町線	笠岡市一番町	不明		3.6	5.6	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						

12. 橋梁　点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			○：点検計画 ●：修繕計画								主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	
2	ぼたん橋	番町29号ー番町三番町線	笠岡市二番町	不明		3.6	5.6	1	RC橋		2019	B	Ⅰ						○					
2	つばき橋	番町31号三番町二番町線	笠岡市二番町	不明		3.6	5.6	1	RC橋		2019	B	Ⅰ						○					
2	やなぎ橋	番町31号三番町二番町線	笠岡市一番町	不明		3.6	5.6	1	RC橋		2019	B	Ⅰ						○					
2	すすき橋	番町39号十番町九番町線	笠岡市七番町	不明		3.6	5.6	1	RC橋		2019	A	Ⅰ						○					
2	ひのき橋	番町40号ー番町九番町線	笠岡市一番町	不明		6.4	12	1	RC橋		2019	B	Ⅰ						○					
2	さくら橋	番町40号ー番町九番町線	笠岡市八番町	不明		4.7	11.6	1	RC橋		2019	B	Ⅰ						○					
2	ひし橋	番町40号ー番町九番町線	笠岡市九番町	不明		3.6	11.2	1	RC橋		2019	B	Ⅰ						○					
2	富岡川1号橋	番町43号九番町一番町線	笠岡市九番町	不明		4.6	5.8	1	RC橋		2019	B	Ⅰ						○					
1	富岡1号橋	富岡9号大磯線	笠岡市富岡	不明		4.2	1.8	2	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	富岡2号橋	富岡13号大磯山畑線	笠岡市富岡	不明		3	2.2	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	富岡8号橋	富岡22号九丁目貳丁目線	笠岡市富岡	不明		4	2.3	1	RC橋		2022	B	Ⅰ									○		
2	富岡9号橋	富岡23号大磯中六丁目線	笠岡市富岡	不明		2.8	2.8	1	RC橋		2022	C	Ⅲ									○		補修済み(R3年度)	4
2	富岡10号橋	富岡47号中六丁目五丁目上井手線	笠岡市富岡	不明		2.7	8	1	PC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	富岡14号橋	富岡58号土手下七丁目先土手下八丁目線	笠岡市富岡	不明		2	2	1	RC橋		2022	B	Ⅱ									○		
2	富岡5号橋	富岡59号本七丁目拾丁目線	笠岡市富岡	不明		3.6	3.5	1	RC橋		2022	B	Ⅰ									○		
1	富岡4号橋	富岡59号本七丁目拾丁目線	笠岡市富岡	不明		3.5	3.5	2	RC橋		2022	C	Ⅲ									○		補修済み(R4年度)	5
1	富岡3号橋	富岡59号本七丁目拾丁目線	笠岡市富岡	不明		4	3.1	2	RC橋		2022	B	Ⅰ									○		
2	富岡7号橋	富岡60号本九丁目先土手下八丁目線	笠岡市富岡	不明		3	4	1	RC橋		2022	B	Ⅱ									○		
2	富岡11号橋	富岡62号中八丁目先土手下八丁目線	笠岡市富岡	不明		3.3	7.9	1	PC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	もみじ橋	番町6号五番町二番町線	笠岡市一番町	不明		3.6	9.6	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○					
2	笠岡14号橋	笠岡141号西本町金崎線	笠岡市笠岡	不明		2.3	0.9	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	富岡川7号橋	笠岡359号大磯線	笠岡市笠岡	不明		2.5	1.2	1	RC橋		2022	B	Ⅱ									○		
2	隅田川20号橋	笠岡34号鮫下谷線	笠岡市笠岡	1987	37	2.5	6.5	1	PC橋		2022	C	Ⅲ									○		補修済み(R4年度)	2
2	応神川8号橋	笠岡345号大磯線	笠岡市笠岡	不明		4	3.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	隅田川22号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	不明		5	8	1	RC橋		2021	A	Ⅰ								○			
2	隅田川23号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	1997	27	5	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	隅田川12号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	不明		5.5	10.6	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○					
2	隅田川24号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	不明		5.7	8	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○				
2	隅田川25号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	不明		5.5	3	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				
2	隅田川26号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	1996	28	5	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	隅田川27号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	1996	28	5	11.6	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	隅田川28号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	1996	28	5	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	隅田川11号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	1997	27	4.8	17	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○					
2	大仙橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	1997	27	5	5.8	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				
2	洲崎橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	不明		5.7	11.3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			
2	隅田川29号橋	笠岡23号鳶ノ子線	笠岡市笠岡	不明		2.3	1	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	本谷川6号橋	今立16号向ヶ市山之神線	笠岡市今立	不明		3	3.15	1	RC橋		2022	C	Ⅲ									○		補修済み(R4年度)	1
2	本谷川3号橋	今立38号本谷線	笠岡市今立	不明		2.5	4.2	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	本谷川2号橋	今立40号堂之前丸山線	笠岡市今立	不明		2.9	4	1	RC橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	本谷川4号橋	今立40号堂之前丸山線	笠岡市今立	不明		2	3.7	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	本谷川5号橋	今立40号堂之前丸山線	笠岡市今立	不明		2.4	7.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		補修済み(R3年度)	0.5
2	今立1号橋	今立80号妻代龍宝山線	笠岡市今立	不明		3	1.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	今立川14号橋	今立82号妻代大谷線	笠岡市今立	不明		3.2	3	1	RC橋		2022	B	Ⅱ									○		
2	今立川12号橋	今立85号大塚線	笠岡市今立	不明		3.8	5.1	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	今立川13号橋	今立86号大塚長恩寺線	笠岡市今立	不明		8.5	4.4	1	RC橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	今立2号橋	今立90号長恩寺休谷線	笠岡市今立	不明		4	1.1	1	石橋		2023	C	Ⅱ										○	
2	今立川11号橋	今立93号大塚大谷線	笠岡市今立	不明		6.4	3.3	1	PC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			
1	今立川10号橋	今立94号沖之上線	笠岡市今立	不明		5.2	2.8	2	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	黒井川1号橋	今立95号妻代峠線	笠岡市今立	不明		2.5	6.7	1	RC橋		2022	B	Ⅱ									○		
2	今立川19号橋	今立112号土井元野菜線	笠岡市今立	不明		5	1.2	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	今立川18号橋	今立118号土井元清水線	笠岡市今立	不明		5.67	5.75	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○				
2	今立川17号橋	今立120号野菜下原線	笠岡市今立	不明		11.95	2.8	1	PC橋		2020	B	Ⅰ		○					○				
2	今立川16号橋	今立131号樫岩沖山線	笠岡市今立	不明		11.93	4.35	1	PC橋		2020	B	Ⅰ		○					○				
2	園井1号橋	園井20号田源大迫線	笠岡市園井	不明		3.6	1.5	1	RC橋		2022	B	Ⅰ									○		
2	園井川13号橋	園井52号道上向ヶ市線	笠岡市園井	不明		2	2.5	1	PC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	園井川6号橋	園井54号向ヶ市溝手線	笠岡市園井	不明		2.5	3	1	石橋		2022	C	Ⅱ									○		
2	園井2号橋	園井83号川西線	笠岡市園井	不明		3	1.6	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	園井川5号橋	園井60号石丸土井線	笠岡市園井	不明		2	4.2	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	園井川4号橋	園井69号茂無運池下線	笠岡市園井	不明		5.8	4.4	1	RC橋		2022	C	Ⅲ									○		補修済み(R5年度)	2
2	園井川3号橋	園井73号運池下池ノ平線	笠岡市園井	不明		2.6	4.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	園井川2号橋	園井79号茂無賀線	笠岡市園井	不明		3.1	4.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	園井3号橋	園井93号山崎線	笠岡市園井	不明		2.2	1.6	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	段原川3号橋	広浜30号上ノ内岡崎線	笠岡市広浜	不明		3.8	4.9	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	段原川1号橋	広浜31号佐古曲井手線	笠岡市広浜	不明		3.6	4.53	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	段原川2号橋	広浜32号佐古線	笠岡市広浜	不明		3.7	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	段原川4号橋	広浜40号段原線	笠岡市広浜	不明		3	1.9	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	馬銅川1号橋	馬銅1号破石線	笠岡市馬銅	1997	27	7.55	4.03	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				
2	馬銅川2号橋	馬銅25号込山大平線	笠岡市馬銅	不明		4.7	6.4	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	馬銅1号橋	馬銅25号込山大平線	笠岡市馬銅	不明		5.4	3.5	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				
2	絵師1号橋	絵師15号山底線	笠岡市絵師	不明		3.3	8.8	1	RC橋		2023	B	Ⅰ										○	
2	猪ノ谷川2号橋	絵師36号昆砂田大磯線	笠岡市絵師	不明		4.2	2.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	園井4号橋	園井24号通ル木線	笠岡市園井	不明		2.1	3.3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	馬銅2号橋	馬銅40号小原線	笠岡市馬銅	不明		4.5	6.2	1	BOX		2022	A	Ⅰ									○		
2	西大島新田6号橋	西大島新田8号岳上り川東線	笠岡市西大島新田	不明		9	3.4	1	PC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			
1	西大島新田5号橋	西大島新田10号川東線	笠岡市西大島新田	不明		8.1	2.02	2	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○				
1	西大島新田4号橋	西大島新田16号川東中島線	笠岡市西大島新田	不明		6.98	0.98	4	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○				
2	西大島新田8号橋	西大島新田16号川東中島線	笠岡市西大島新田	不明		2.5	5.2	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	西大島新田3号橋	西大島新田22号川東中島線	笠岡市西大島新田	不明		7.46	2	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○				
2	西大島新田9号橋	西大島新田22号川東中島線	笠岡市西大島新田	不明		2.6	5.5	1	BOX		2022	A	Ⅰ									○		
2	西大島新田10号橋	西大島新田23号川東線	笠岡市西大島新田	不明		3.4	4.3	1	RC橋		2022	B	Ⅰ									○		
2	西大島新田7号橋	西大島新田23号川東線	笠岡市西大島新田	不明		3.6	4	1	RC橋		2022	B	Ⅱ									○		
2	津雲川3号橋	西大島新田25号ー丁目二丁目線	笠岡市西大島新田	不明		1.8	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	石樋川2号橋	西大島新田25号ー丁目二丁目線	笠岡市西大島新田	不明		3.4	1.8	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	西大島新田11号橋	西大島新田25号ー丁目二丁目線	笠岡市西大島新田	不明		4.9	2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ										○	
1	西大島新田1号橋	西大島新田26号三丁目山下線	笠岡市西大島新田	不明		7.38	1.28	4	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○				
2	西大島新田2号橋	西大島新田26号三丁目山下線	笠岡市西大島新田	不明		3.4	2.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	津雲川1号橋	西大島新田27号三丁目ー丁目線	笠岡市西大島新田	不明		4.6	3	1	RC橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	西大島新田14号橋	西大島新田31号ー丁目線	笠岡市西大島新田	不明		2.4	5	1	RC橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	石樋川3号橋	西大島新田31号ー丁目線	笠岡市西大島新田	不明		2.9	4.9	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		補修済み(R3年度)	4.5
2	西大島新田16号橋	西大島新田33号二丁目ー丁目線	笠岡市西大島新田	不明		2.4	1.8	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	西大島新田13号橋	西大島新田35号ー丁目線	笠岡市西大島新田	不明		2.1	2.7	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	西大島新田12号橋	西大島新田36号ー丁目線	笠岡市西大島新田	不明		4	7	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	西大島1号橋	西大島2号小黒崎線	笠岡市西大島	不明		3.5	4.7	1	RC橋		2022	B	Ⅰ									○		
2	西大島2号橋	西大島11号小黒崎砂線	笠岡市西大島	不明		2.3	2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	西大島3号橋	西大島21号小黒崎線	笠岡市西大島	不明		2.6	2.9	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	西大島4号橋	西大島23号小黒崎小黒崎台線	笠岡市西大島	不明		2.1	2	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	西大島5号橋	西大島71号浜小黒崎線	笠岡市西大島	不明		2.8	1.8	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	西大島7号橋	西大島89号矢部砂線	笠岡市西大島	不明		2.1	3.9	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	石樋川8号橋	西大島106号原ノ西砂崎線	笠岡市西大島	不明		3.8	2	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	石樋川7号橋	西大島134号原線	笠岡市西大島	不明		2.5	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	大昌川3号橋	西大島150号宗国線	笠岡市西大島	不明		3.4	1.1	1	石橋		2022	A	Ⅰ									○		
2	大昌川6号橋	西大島172号唐井天神間線	笠岡市西大島	不明		2.8	2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	西大島8号橋	西大島172号唐井天神間線	笠岡市西大島	不明		2.6	2.2	1	石橋		2023	A	Ⅰ										○	
2	西大島10号橋	西大島172号唐井天神間線	笠岡市西大島	不明		2.2	2.6	1	石橋		2023	C	Ⅲ										○	補修済み(R5年度)	1

12. 橋梁　点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			○:点検計画 ●:修繕計画									主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)		
2	西大島11号橋	西大島196号阿正谷前砂線	笠岡市西大島	不明		3.8	6.1	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	西大島9号橋	西大島202号阿正谷ワラビ線	笠岡市西大島	不明		4.8	2.1	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大島川13号橋	西大島207号寺ヶ端線	笠岡市西大島	不明		4.7	1	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大島川12号橋	西大島208号寺ヶ端恩徳線	笠岡市西大島	不明		6.6	3.65	1	PC橋		2020	M	Ⅱ		○					○					
2	西大島15号橋	西大島219号恩徳池尻恩徳線	笠岡市西大島	不明		2.1	1.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大島川11号橋	西大島223号恩徳池尻線	笠岡市西大島	不明		6.2	3.83	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	大島川10号橋	西大島229号原谷線	笠岡市西大島	不明		6	2.8	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○				同年度点検後補修済み(R2年度)	1
2	大島川8号橋	西大島236号川手線	笠岡市西大島	不明		7.05	3.62	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	西大島16号橋	西大島237号矢部前伝兵衛山線	笠岡市西大島	不明		2.1	2.4	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大島川7号橋	西大島237号矢部前伝兵衛山線	笠岡市西大島	不明		8.2	1.81	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	大島川6号橋	西大島239号川手線	笠岡市西大島	1976	48	7.825	3.63	1	PC橋		2020	M	Ⅱ		○					○					
2	石礒川5号橋	西大島252号古浜石砂線	笠岡市西大島	不明		2.3	6.6	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	大島川3号橋	西大島252号古浜石砂線	笠岡市西大島	不明		7.68	4.83	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
1	大島川1号橋	西大島254号浜平島線	笠岡市西大島	不明		12.5	2.5	6	石橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	西大島新田17号橋	西大島255号長通線	笠岡市西大島	不明		4.8	2.3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大島川2号橋	西大島262号石砂線	笠岡市西大島	不明		7.95	3.65	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	石砂川3号橋	西大島262号石砂線	笠岡市西大島	不明		2.8	10.35	1	石橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	石砂川1号橋	西大島264号石砂線	笠岡市西大島	不明		2.1	2	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	石砂川4号橋	西大島271号石砂線	笠岡市西大島	不明		2.4	4.7	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	西大島17号橋	西大島336号鳥ノ江線	笠岡市西大島	不明		2.5	2	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	西大島新田18号橋	西大島新田37号二丁目三丁目線	笠岡市西大島新田	不明		3	4.1	1	PC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	西大島新田19号橋	西大島新田38号川東中島線	笠岡市西大島新田	2010	14	6.8	6.83	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	大島川15号橋	大島中1号新田僧都線	笠岡市大島中	不明		4.4	1.6	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	大島中1号橋	大島中7号天神池北両家線	笠岡市大島中	不明		3.8	3	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	大島川16号橋	大島中10号波止ノ端天神池線	笠岡市大島中	不明		4.3	1.4	1	鋼橋		2022	C	Ⅲ				○					○		補修済み(R4年度)	1
2	大島中2号橋	大島中13号北両家天神平線	笠岡市大島中	不明		2.2	2.6	1	石橋		2023	C	Ⅱ					○					○		
2	大島中3号橋	大島中46号フルモリセイキナ線	笠岡市大島中	不明		4.65	2.4	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	大島川14号橋	大島中86号竹田吉田原線	笠岡市大島中	2002	22	5	9.2	1	BOX		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	土生川3号橋	大島中114号北ノ前延原線	笠岡市大島中	1988	36	3.3	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	切子川1号橋	大島中119号後ヶ市川手線	笠岡市大島中	不明		2.1	4.6	1	石橋		2023	B	Ⅰ					○					○		
2	土生川2号橋	大島中123号道後小林線	笠岡市大島中	不明		2.4	8.1	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○		補修済み(R4年度)	5
2	切子川2号橋	大島中145号切子中井開地線	笠岡市大島中	不明		2.8	2.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○		補修済み(R3年度)	2
2	切子川3号橋	大島中146号切子線	笠岡市大島中	不明		4.4	2	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大島川17号橋	大島中154号十地切子線	笠岡市大島中	不明		2.8	2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	大島川18号橋	大島中163号正信川手前線	笠岡市大島中	不明		2.2	2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	大島川19号橋	大島中168号乗時前大谷開地線	笠岡市大島中	不明		3.9	3.4	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○	●				○			ひび割れ注入	0.5
2	大島川21号橋	大島中194号明地線	笠岡市大島中	不明		2.6	1.4	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	大島川22号橋	大島中195号上湯舟山代線	笠岡市大島中	不明		2.1	2.7	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大島中5号橋	大島中236号松陰平海方線	笠岡市大島中	不明		2.5	3	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	大工浜川1号橋	大島中285号大工川東線	笠岡市大島中	不明		3.5	5.9	1	PC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大島中6号橋	大島中334号正頭大久保線	笠岡市大島中	不明		2.2	1.3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	土生川4号橋	大島中120号僧都小林線	笠岡市大島中	不明		2.4	2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	美の浜1号橋	美の浜5号線	笠岡市美の浜	不明		2	18.5	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○					補修済み(H29年度)	5
2	美の浜2号橋	美の浜5号線	笠岡市美の浜	不明		2.9	18.5	1	RC橋		2019	C	Ⅱ	○					○					補修済み(R3年度)	5
2	美の浜3号橋	美の浜6号線	笠岡市美の浜	不明		2.9	12.7	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○					同年度点検後補修済み(R1年度)	1
2	美の浜4号橋	美の浜7号線	笠岡市美の浜	不明		2	9.1	1	RC橋		2019	A	Ⅰ	○					○					補修済み(H30年度)	5
2	美の浜5号橋	美の浜7号線	笠岡市美の浜	不明		2.9	10.7	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○					補修済み(R2年度)	5
2	美の浜6号橋	美の浜12号線	笠岡市美の浜	不明		2	7.9	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○					ひび割れ補修・断面修復	1
2	美の浜7号橋	美の浜17号線	笠岡市美の浜	不明		2	8.3	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○					補修済み(H30年度)	1
2	美の浜8号橋	美の浜18号線	笠岡市美の浜	不明		2	8	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○					補修済み(H30年度)	1
2	美の浜9号橋	美の浜31号線	笠岡市美の浜	不明		2.9	8.5	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○					○				補修済み(R4年度)	5
2	美の浜10号橋	美の浜34号線	笠岡市美の浜	不明		2.9	5.8	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	美の浜11号橋	美の浜47号線	笠岡市美の浜	不明		2.9	10.9	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	美の浜12号橋	美の浜48号線	笠岡市美の浜	不明		2.9	8.4	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	美の浜13号橋	美の浜53号線	笠岡市美の浜	不明		2.9	11	1	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	横島1号橋	横島19号孫治端大戸渕線	笠岡市横島	不明		3.5	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	入江1号橋	入江7号成ヶ端線	笠岡市入江	不明		3.7	4.6	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	横島2号橋	横島91号大戸渕竹ヶ端線	笠岡市神島	不明		3	6	1	RC橋		2022	M	Ⅱ				○					○			
2	美の浜14号橋	美の浜62号線	笠岡市美の浜	不明		2.8	13.7	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○				補修済み(H30年度)	1
2	美の浜15号橋	美の浜63号線	笠岡市美の浜	不明		2.8	13.7	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○				補修済み(H30年度)	1
2	古江川1号橋	神島121号古江樋ノ口古江笹尾線	笠岡市神島	不明		2.5	3.8	1	石橋		2023	B	Ⅰ					○					○		
1	東村川2号橋	神島143号深方申酉東村出線	笠岡市神島	不明		6.1	1.02	2	RC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	東村川1号橋	神島151号東村坪ノ内東村胡堂線	笠岡市神島	不明		4.4	6.8	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	福浦川3号橋	神島206号中村宮ノ脇寺間大三谷線	笠岡市神島	不明		7.55	6.5	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	神島1号橋	神島206号中村宮ノ脇寺間大三谷線	笠岡市神島	不明		7.55	6.26	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	福浦川2号橋	神島240号福浦堂廻福浦射場線	笠岡市神島	2010	14	3.8	3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	福浦川1号橋	神島246号福浦前畑福浦浜線	笠岡市神島	不明		2.9	1.9	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	神島3号橋	神島326号寺間諸蔵寺間川ノ本線	笠岡市神島	不明		4	1	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	神島2号橋	神島332号寺間諸蔵見崎池ノ内線	笠岡市神島	不明		3.7	3	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	浅王川1号橋	神島383号見崎山見崎天ヶ端線	笠岡市神島	不明		4.4	2.6	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	福浦川4号橋	神島389号中村岡ノ辻福浦浜ノ上線	笠岡市神島	不明		3.2	4.9	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	神島4号橋	神島389号中村岡ノ辻福浦浜ノ上線	笠岡市神島	不明		2.9	3.5	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	高川1号橋	神島273号カウ西崎カウウジ ノ前線	笠岡市神島	不明		2.4	1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	中村川1号橋	神島外浦53号鳳福寺中西上線	笠岡市神島外浦	不明		2.4	6.1	1	BOX		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大道谷川1号橋	神島外浦100号平山苗松線	笠岡市神島外浦	不明		2.4	8.5	1	BOX		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	高須川1号橋	高島20号内高須黒土線	笠岡市高島	不明		2.8	6.8	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○	●				○			断面修復	1
2	高須川2号橋	高島24号内高須奥内高須線	笠岡市高島	不明		2.7	6.7	1	RC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	新川5号橋	白石島17号前新遅宮ノ端線	笠岡市白石島	不明		3.9	7.1	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○	●				○			断面修復	1
2	新川2号橋	白石島18号塚ノ平塚ノ前線	笠岡市白石島	不明		4	7.8	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	新川3号橋	白石島20号中條池ノ原線	笠岡市白石島	不明		3.8	1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	新川4号橋	白石島21号上浦塚ノ前線	笠岡市白石島	不明		3.8	2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	新川6号橋	白石島27号前新遅塚ノ平線	笠岡市白石島	不明		3.5	7	1	RC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	新川7号橋	白石島28号前新遅片上線	笠岡市白石島	不明		3.4	1	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	新川9号橋	白石島33号儘ヶ奥持立線	笠岡市白石島	不明		2.3	1.5	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	新川11号橋	白石島73号儘ヶ奥線	笠岡市白石島	不明		2.3	2.7	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	白石島1号橋	白石島80号先西尼木線	笠岡市白石島	不明		5	3.3	1	RC橋		2023	E	Ⅳ					○					○	通行止め	
2	神島外浦3号橋	神島外浦33号小水沖線	笠岡市神島外浦	不明		2.3	6.6	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	豊浦川3号橋	北木島町17号豊浦野路線	笠岡市北木島町	不明		3.7	3.7	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○			補修済み(R2年度)	1
2	豊浦川1号橋	北木島町20号豊浦線	笠岡市北木島町	不明		3.2	2.8	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	豊浦川5号橋	北木島町27号豊浦線	笠岡市北木島町	不明		3.7	2.7	1	RC橋		2021	C	Ⅱ			○					○				
2	豊浦川6号橋	北木島町30号豊浦線	笠岡市北木島町	不明		2.2	2.3	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○	●				○			断面修復	1
2	豊浦川2号橋	北木島町40号豊浦東平線	笠岡市北木島町	不明		2.9	3.1	1	RC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	北木島1号橋	北木島町47号豊根測線	笠岡市北木島町	不明		3	6.7	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○				補修済み	3
2	北木島2号橋	北木島町122号小浜線	笠岡市北木島町	不明		2.7	1.3	1	石橋		2023	B	Ⅰ					○					○		
2	北木島3号橋	北木島町138号平山塚浜線	笠岡市北木島町	不明		2.9	6.8	1	RC橋		2023	B	Ⅰ					○					○		
2	千ノ浜川1号橋	北木島町156号豊浦千ノ浜線	笠岡市北木島町	不明		3.7	6.5	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	金風呂川1号橋	北木島町172号摺鉢大金風越線	笠岡市北木島町	不明		3.5	7.4	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	北木島4号橋	北木島町176号摺鉢大金風呂線	笠岡市北木島町	不明		2.2	2.8	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	向川1号橋	北木島町176号摺鉢大金風呂線	笠岡市北木島町	不明		3.6	3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	西川1号橋	北木島町176号摺鉢大金風呂線	笠岡市北木島町	不明		3.2	3.9	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	向川2号橋	北木島町192号向川大峠線	笠岡市北木島町	不明		3.4	2.3	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	向川3号橋	北木島町192号向川大峠線	笠岡市北木島町	不明		3.4	1.5	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	向川4号橋	北木島町192号向川大峠線	笠岡市北木島町	不明		4.6	1	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○			補修済み(R2年度)	1
2	西川2号橋	北木島町195号大金風呂線	笠岡市北木島町	不明		2.3	1.5	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		

12. 橋梁　点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			○:点検計画 ●:修繕計画									主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)		
2	北木島5号橋	北木島町197号大金風呂線	笠岡市北木島町	不明		3.2	2.4	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	向川5号橋	北木島町231号向川線	笠岡市北木島町	不明		3.3	1.5	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	大浦川1号橋	北木島町271号金風呂越線	笠岡市北木島町	不明		2.8	1.5	1	RC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	北木島6号橋	北木島町286号椎木入汐線	笠岡市北木島町	不明		3.4	2.9	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	北木島7号橋	北木島町286号椎木入汐線	笠岡市北木島町	不明		2.5	2.9	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	北木島8号橋	北木島町286号椎木入汐線	笠岡市北木島町	不明		3.1	2.8	1	RC橋		2021	B	Ⅰ			○					○				
2	北木島11号橋	北木島町302号本村椎木原線	笠岡市北木島町	不明		2.5	2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	北木島10号橋	北木島町326号大浦線	笠岡市北木島町	不明		2.2	1.8	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	柳川2号橋	北木島町334号本村線	笠岡市北木島町	不明		2.4	2	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	北木島9号橋	北木島町334号本村線	笠岡市北木島町	不明		2.2	2	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	柳川1号橋	北木島町341号南大浦越線	笠岡市北木島町	不明		3	5.5	1	RC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	大浦川2号橋	北木島町341号南大浦越線	笠岡市北木島町	不明		2	1.8	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	北木島12号橋	北木島町411号漕網師丸岩線	笠岡市北木島町	不明		2	1	1	RC橋		2021	C	Ⅲ			○	●				○			断面修復	1
2	真鍋島2号橋	真鍋島57号浦ノ内線	笠岡市真鍋島	不明		3.7	2.4	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	真鍋島3号橋	真鍋島66号浦ノ内矢崎線	笠岡市真鍋島	不明		2	3	1	RC橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	犬塚川9号橋	東大戸有田線	笠岡市有田	不明		4.3	9.9	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	犬塚川10号橋	東大戸有田線	笠岡市有田	不明		2.4	11.5	1	PC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	寺谷川6号橋	東大戸有田線	笠岡市有田	不明		4.6	13.6	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
2	西の谷川9号橋	東大戸有田線	笠岡市東大戸	不明		12.6	7.7	1	PC橋		2020	C	Ⅱ		○					○					
2	隅田川30号橋	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡	不明		5	17	1	RC橋		2020	C	Ⅲ		○	●		●			○			補修済み(H29年度：25百万円) 再劣化部補修	25
2	富岡15号橋	笠岡駅今井線	笠岡市富岡	不明		3.6	3.3	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○				補修済み(R1年度)	2.6
2	本谷川1号橋	笠岡中央線	笠岡市今立	不明		2	2.2	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	大河川9号橋	吉浜209号井手池尻線	笠岡市吉浜	不明		5.4	4.4	1	RC橋		2020	B	Ⅰ		○					○					
1	稲富稲荷跨線橋	笠岡283号伏越古城山下線	笠岡市笠岡	不明		10.6	3.7	1	RC橋	跨線	2019	C	Ⅲ			○					○			コンクリート桁補強、橋面防水、断面修復	3.6
2	笠岡15号橋	笠岡283号伏越古城山下線	笠岡市笠岡	不明		5	2.7	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
1	馬飼中央橋	馬飼40号小原三十田線	笠岡市馬飼	2012	12	22.3	6.4	1	PC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
1	馬飼平成橋	馬飼19号前田砂入線	笠岡市馬飼	2014	10	20.7	6.4	1	PC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	馬飼3号橋	馬飼7号池尻原線	笠岡市馬飼	不明		4.6	5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	絵師2号橋	絵師48号落合壱丁目線	笠岡市絵師	不明		2.5	8.5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	絵師3号橋	絵師49号落合線	笠岡市絵師	不明		2.1	9.7	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	馬飼4号橋	馬飼19号前田砂入線	笠岡市馬飼	2014	10	2.9	12	1	BOX		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	長迫川14号橋	新賀154号宮ノ脇線	笠岡市新賀	不明		3.4	1.8	1	石橋		2023	A	Ⅰ					○					○		
2	北木島13号橋	北木島町441号鳶ノ子上松原線	笠岡市北木島町	1960	64	2.7	4.7	1	RC橋		2023	B	Ⅰ					○					○		

集計

項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	備考
点検橋梁数	136	190	142	152	137	136	190	142	152	137	
修繕橋梁数	6	12	20	1	0	0	0	0	0	0	

管理対象外

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			○:点検計画 ●:修繕計画									主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)		
矢掛町との共同管理																								
－	共栄橋	共栄線	矢掛町小田	1996	28	113	8.2	5	PC橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
井原市との共同管理																								
－	薬師橋	走出7号黒田辻畑線	笠岡市走出	1969	55	160	3.6	6	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					

13. 大型カルバート 点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨道	点検記録			○:点検計画 ●:修繕計画										主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)		
1	西大戸1号カルバート	西大戸堂ノ内線	笠岡市西大戸	2004	17	13.0	8.1	1	大型カルバート		2022	B	Ⅱ				○					○			
1	西大戸2号カルバート	西大戸堂ノ内線	笠岡市西大戸	2003	18	13.0	6.4	1	大型カルバート		2022	B	Ⅱ				○					○			
1	西大戸3号カルバート	西大戸30号鐘鋳東大谷線	笠岡市西大戸	不明		5.0	7.4	1	大型カルバート		2022	B	Ⅱ				○								

集計

項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	備考
点検橋梁数	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	
修繕橋梁数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
